

بلوک D1

گزارش عملکرد ماهانه
مرداد ماه ۱۴۰۳

امیران
آبتبار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر



۱۴۰۳.۰۵.۳۱

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۰۴.۳۱




- ادامه نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال غربی و بال شرقی
- **ادامه** نصب پارت دوم داربست در نمای بلوک (طبقه ۱۴ الی ۲۹) جهت اجرای نما
- ادامه سرامیک کاری دیوارهای راه پله های بال غربی و بال شرقی
- **اتمام** نصب پنجره واحدهای مسکونی در طبقه **۸+ الی ۱۴** بال شرقی و بال غربی
- ادامه نصب پنجره واحدهای مسکونی در طبقه **۷+** بال شرقی و بال غربی
- **ادامه** زیر سازی جهت اجرای نما در بال غربی
- **اتمام** کف سازی واحدهای مسکونی طبقه **۱۰+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه **۱۱ و ۱۲+**
- اجرای گچکاری (روکار) در طبقات **۳+ و ۴+**، بال شرقی و بال غربی
- اجرای گچکاری (زیرکار) در طبقه **۸+ و ۱۲** بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه **۲۶+** بال شرقی
- **آغاز و اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه **۲۶+** و **۲۷+** بال غربی
- **ادامه** تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه **۱۷+**، **۱۸+** و **۱۹+** بال غربی
- **ادامه** نصب رانر و استاد و نصب پتل دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه **۱۳+ الی ۱۶+** بال شرقی و بال غربی
- **ادامه** سرامیک کاری کف واحد ها و کاشی کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های مسکونی طبقه **۱۱+** بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** کاشی کاری بدنه سرویس ها و آشپزخانه طبقه **۱۱+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و عایق بندی آشپزخانه و سرویس ها و تراس های طبقه **۱۲+** بال شرقی و غربی
- اجرای زیر سازی سقف جهت اجرای سقف کاذب در طبقه **۳+** بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** زیر سازی سقف جهت اجرای سقف کاذب در طبقه **۴+** بال غربی
- ادامه ساخت چارچوب های (فرانسوی) درب واحد های مسکونی
- ادامه ساخت فریم تراس ها

- **آغاز نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال غربی**
- **ادامه** نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال شرقی
- **آغاز** نصب پارت دوم داربست در نمای بلوک (طبقه ۱۴ الی ۲۹) جهت اجرای نما
- **آغاز** سرامیک کاری دیوارهای راه پله شمالی بال غربی و بال شرقی
- **آغاز** نصب پنجره واحد های مسکونی در طبقه **۱۴+** بال شرقی
- **ادامه** زیر سازی جهت اجرای نما در بال غربی
- اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه **۱۰+** بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** اجرای گچکاری (روکار) در طبقه **۳+** بال شرقی و بال غربی
- ادامه اجرای گچکاری (زیرکار) در طبقه **۸+ الی ۱۲+** بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه **۲۶+** بال شرقی
- **ادامه** تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه **۱۷+**، **۱۸+** و **۱۹+** بال غربی
- **ادامه** نصب رانر و استاد و نصب پتل دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه **۱۳+ الی ۱۶+** بال شرقی و بال غربی
- **ادامه** سرامیک کاری و کاشی کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های مسکونی طبقه **۱۰+** بال غربی
- **اجرای** سرامیک کاری کف واحد ها و کاشی کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحد های مسکونی طبقه **۱۰+** بال شرقی
- اجرای شیب بندی و عایق بندی آشپزخانه و سرویس ها و تراس های طبقه **۱۲+** بال شرقی و غربی
- ادامه ساخت چارچوب های (فرانسوی) درب واحد های مسکونی
- ادامه ساخت فریم تراس ها




شرح اجرا

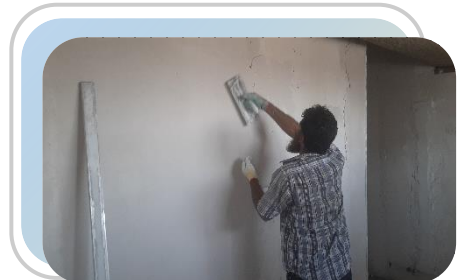

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

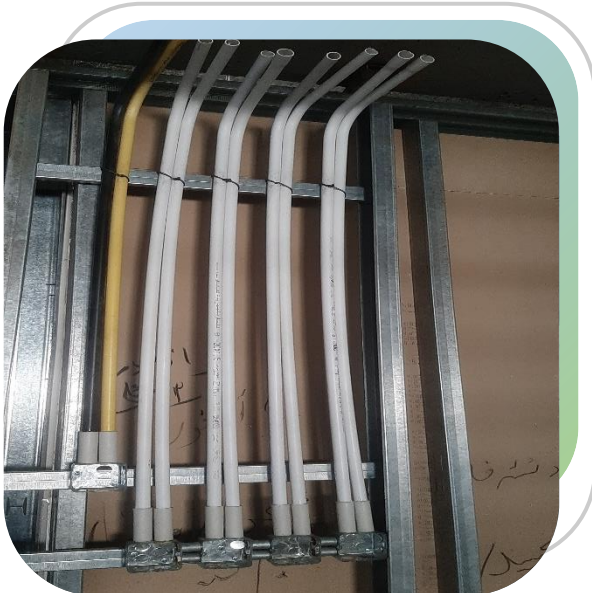


تاسیسات



- ادامه اجرای تاسیسات الکتریکال در طبقات ۱۲+ و ۱۳+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای تاسیسات مکانیکال در ۱۴+ و ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی آتشنشانی داخل واحد های مسکونی طبقه ۶+ بال غربی و بال شرقی
- ادامه ساخت و نصب کانالهای تهویه در طبقات

شرح اجرا

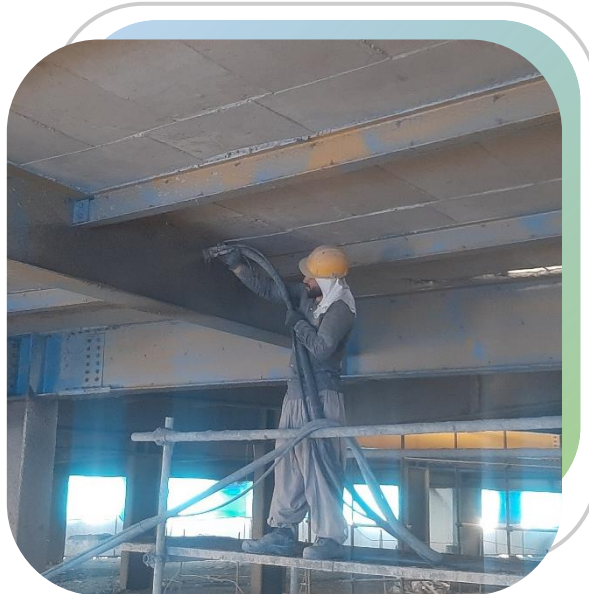

پاشش ضد حریق

○ اجرای زیر سازی جهت پاشش ضد حریق در طبقه ۲۲+ و ۲۳+ بال غربی

○ اجرای پاشش ضد حریق طبقه ۲۱+ بال غربی

شرح اجرا




راه پله



○ اجرای قالب بندی و آرماتور بندی راه پله های بال شرقی و بال غربی

○ ادامه بتن ریزی راه پله های بال شرقی و بال غربی


شرح اجرا 

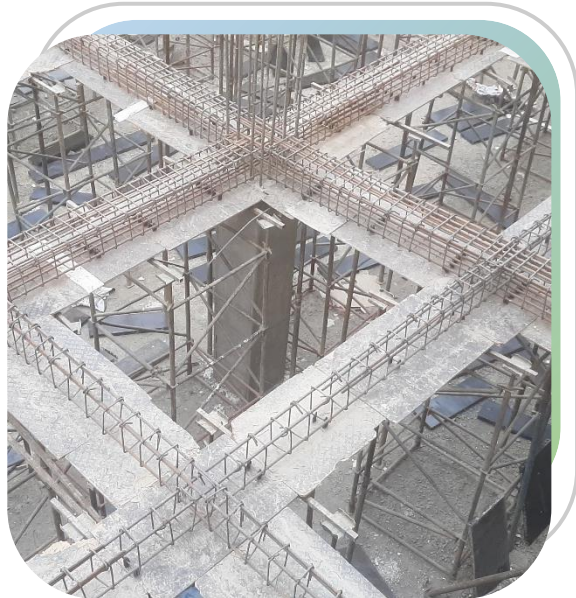

پارکینگ الحاقی


- کاشت میلگرد جهت اتصال ستون و تیر سازه الحاقی به سازه اصلی
- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی تیرهای اصلی سقف طبقه ۳- (پارت دوم)
- اجرای آرماتور بندی ستون ها و دیوار حائل شرقی و شمالی طبقه ۲- (پارت اول)

✎ شرح اجرا

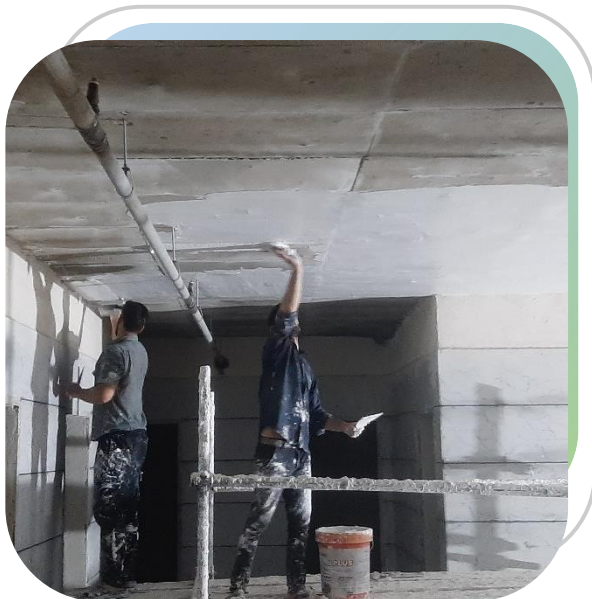

پارکینگ و انباری

✎ **شرح اجرا** ○ اجرای ساب زنی و بتونه کاری سقف پارکینگ طبقه ۴- جهت رنگ کاری و اپوکسی

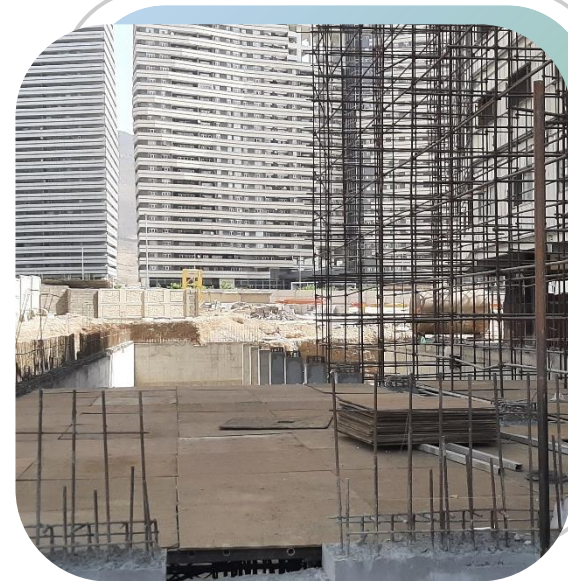

موتورخانه

شرح اجرا ○ اجرای قالب بندی و آرماتور بندی سقف موتورخانه (پارت اول)



تخلیه بار

- ورود و تخلیه ورق های کامپوزیت جهت اجرا و نصب نما در محل پروژه
- ورود و تخلیه پنل های بتنی جهت استفاده در سقف طبقه ۳- پارکینگ الحاقی (پارت دوم)
- ورود و تخلیه مصالح (سیمان، ماسه، سیمان سفید، گچ و ...)
- ورود و تخلیه چسب ایزی وال و مواد ضد حریق در محل پروژه
- ورود و تخلیه سنگ پله در محل پروژه

شرح اجرا

۱۴۰۳.۰۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۰۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۰۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۰۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



