

بلوک N3

گزارش عملکرد ماهانه
مرداد ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۳.۵.۳۱

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۴.۳۱



- **اتمام** قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۵ (کف +۱۶) هسته مرکزی

شرح اجرا 



- **اتمام** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۵ (کف +۱۶) ضلع شرقی



- اجرای قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۵ (کف +۱۶) هسته مرکزی

شرح اجرا 



- اجرای آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۵ (کف +۱۶) ضلع شرقی




۱۴۰۳.۵.۳۱

اجرای ستون

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

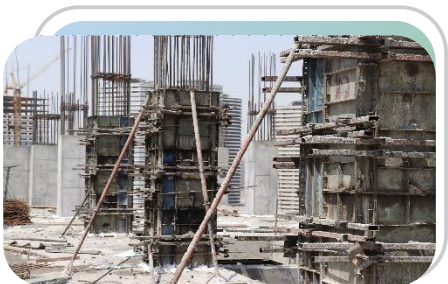

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون
های طبقه ۱۶+ ضلع غربی



شرح اجرا



○ اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون
های طبقه ۱۶+ ضلع غربی

○ اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۶+ هسته
مرکزی



۱۴۰۳.۵.۳۱

نصب پنل

۱۴۰۳.۴.۳۱




شرح اجرا



○ **اتمام** نصب پنل سقف طبقه ۱۵ + (کف ۱۶)
هسته مرکزی



شرح اجرا

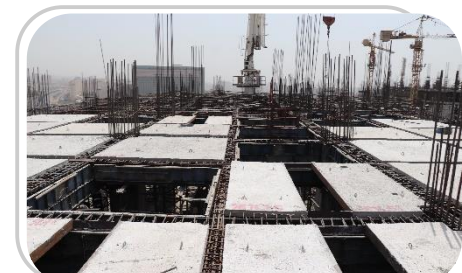

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۱۵ + (کف ۱۶)
هسته مرکزی



دیوار برشی و راه پله

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۵ + به ۱۶ + شماره سه

✎ **شرح اجرا**

○ **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۵ + به ۱۶ + شماره چهار




۱۴۰۳.۵.۳۱

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۴.۳۱




شرح اجرا

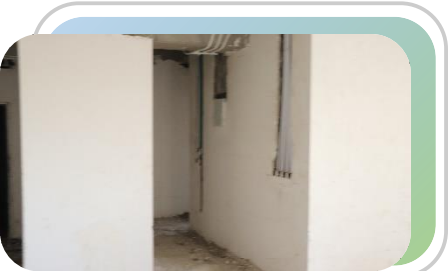




- **آغاز** ساخت و نصب وال پست جهت نصب ایزی وال در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۲+
- **آغاز** نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+
- **آغاز** نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقه ۹+
- **اتمام** تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۹+
- **آغاز** سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۳+ الی ۷+
- **اتمام** گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- **آغاز** گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- **اتمام** نصب کاشی سرامیک دیوار سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۲+
- **آغاز** نصب داکت کانال تهویه واحدهای مسکونی طبقات ۴+ الی ۵+



شرح اجرا

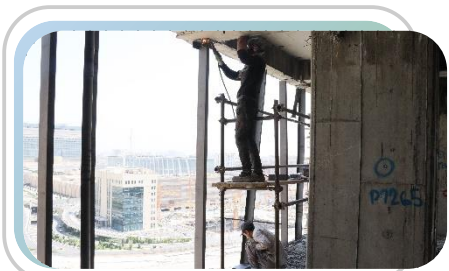


- اجرای ساخت و نصب وال پست جهت نصب ایزی وال در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+
- **آغاز** ساخت و نصب وال پست جهت نصب ایزی وال در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- اجرای نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۶+ الی ۸+
- **اتمام** سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقه ۱+ به ۲+
- اجرای سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۳+ الی ۷+
- اجرای نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقات ۶+ الی ۸+
- **اتمام** شیب بندی و قیرگونی کف سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۲+
- **آغاز** نصب داکت کانال تهویه واحدهای مسکونی طبقات ۱+ الی ۳+

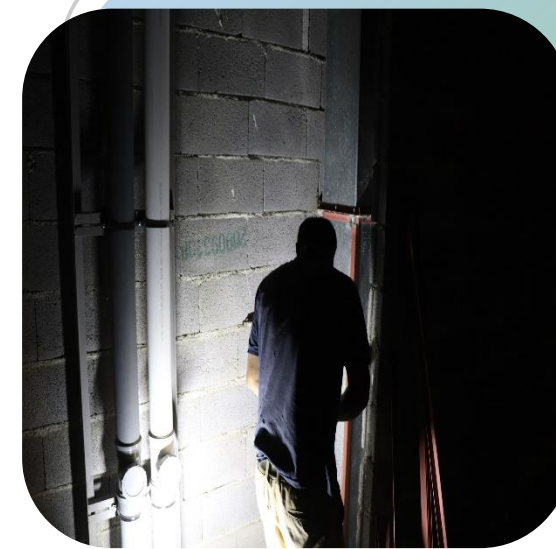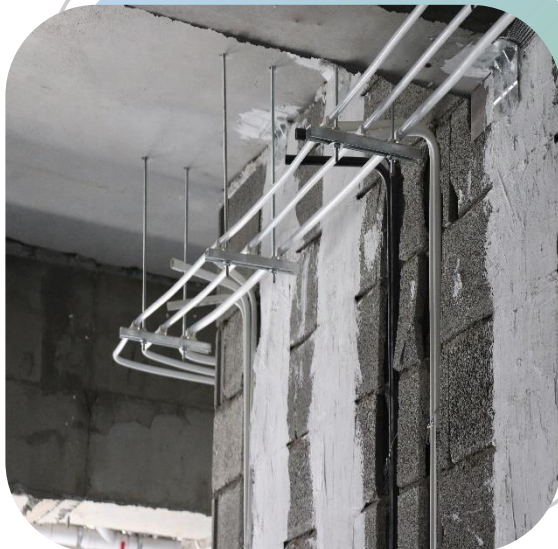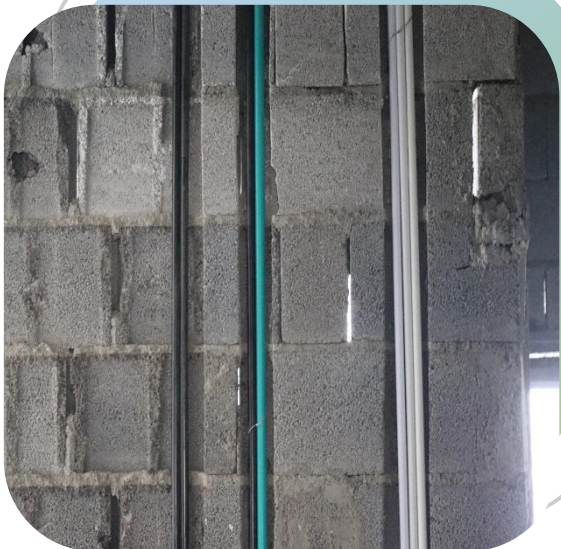

تاسیسات

- اجرای نصب لوله برق سقف و دیوار و قوطی کلید پریز واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- آغاز نصب لوله برق سقف و دیوار و قوطی کلید پریز واحدهای مسکونی طبقات ۵+ و ۶+
- اجرای شیارزنی جهت نصب لوله برق واحدهای مسکونی طبقه ۷+
- آغاز شیارزنی جهت نصب لوله برق واحدهای مسکونی طبقه ۸+
- اجرای نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- آغاز نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- اجرای نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- آغاز نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۷+

شرح اجرا

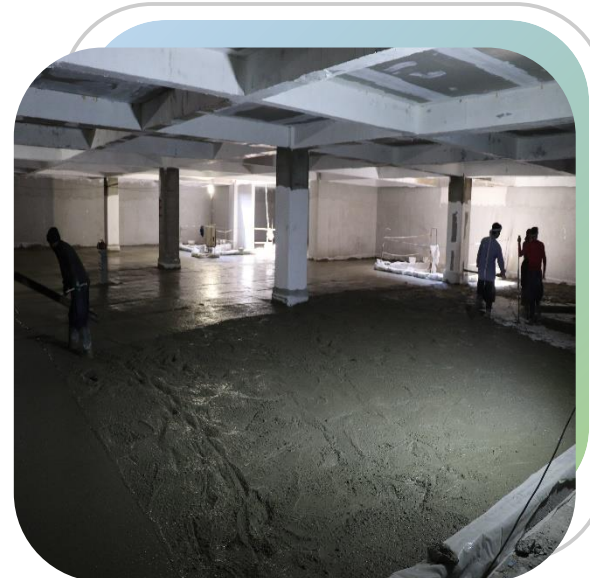

انبباری ها و پارکینگ

○ **اتمام** اجرای بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- پارت پنجم و ششم و هفتم

شرح اجرا

○ ادامه اجرای بتونه کاری دیوار و سقف پارکینگ طبقه ۲-



تخلیه بار

- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی
- ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی
- شرح اجرا  ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودرسنگ ، گچ)
- ورود و تخلیه سکشن تاور و اتمام نصب و راه اندازی تاور سوم در ضلع شمالی برج
- ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال


۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)

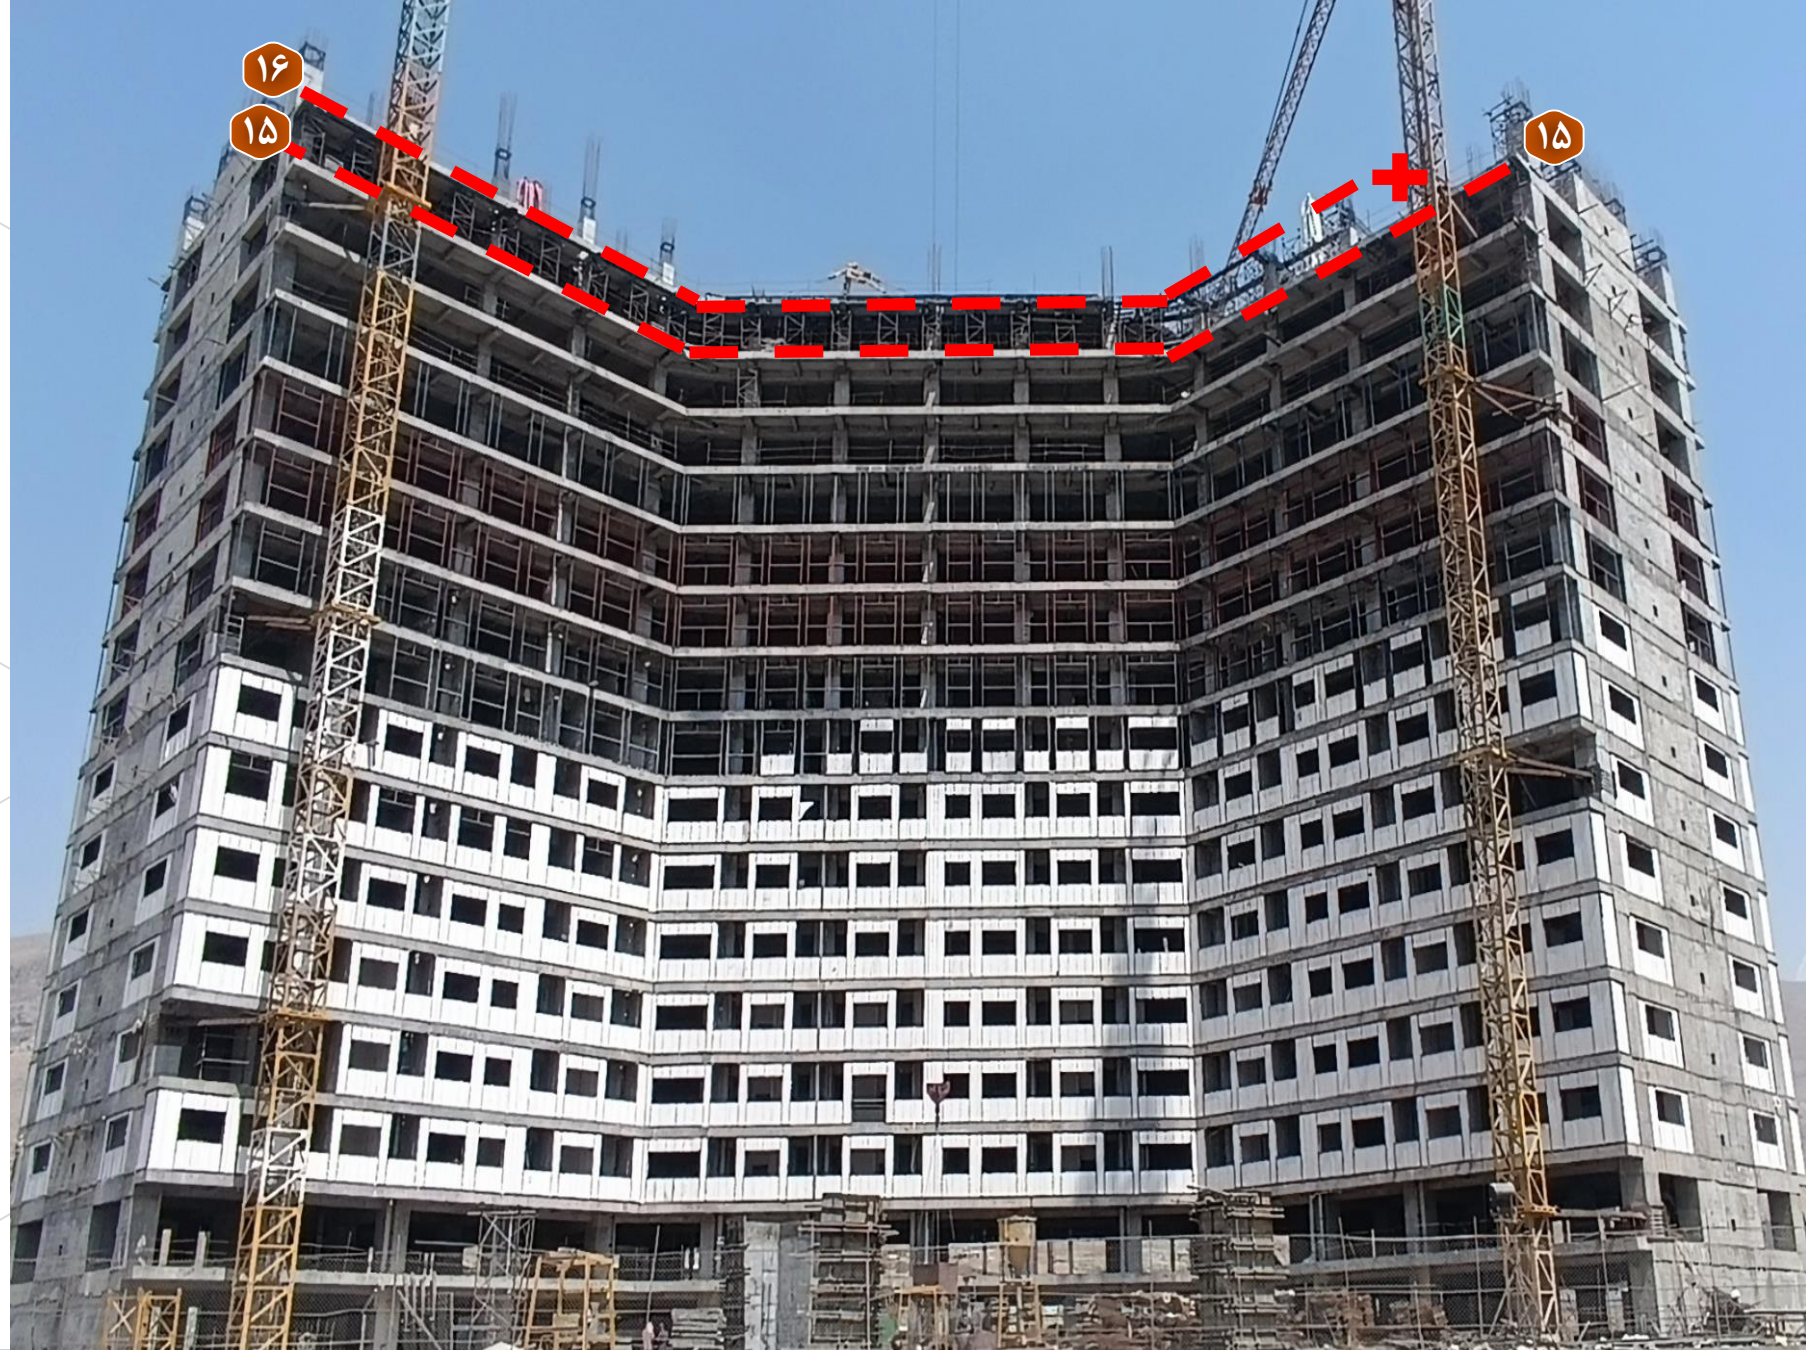

۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



