

بلوک N3

گزارش عملکرد ماهانه
مهر ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com



۱۴۰۳.۷.۳۰

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۶.۳۱




شرح اجرا



- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) ضلع غربی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی
- **آغاز** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) هسته مرکزی
- **آغاز** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) هسته مرکزی
- **آغاز** آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) ضلع شرقی



شرح اجرا

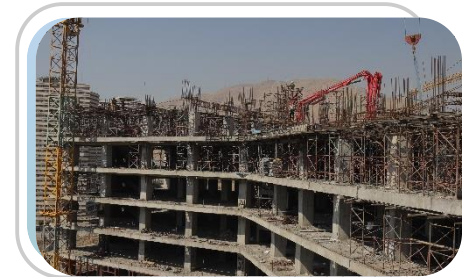

- **اتمام** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۵+ (کف ۱۶+) هسته مرکزی
- **اتمام** قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۵+ (کف ۱۶+) ضلع شرقی



۱۴۰۳.۷.۳۰

اجرای ستون

۱۴۰۳.۶.۳۱



شرح اجرا



- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷+ ضلع غربی
- **آغاز و اتمام** قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۶+ هسته مرکزی
- **آغاز** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷+ هسته مرکزی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۶+ ضلع شرقی
- **آغاز** قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۶+ ضلع شرقی



شرح اجرا



- **اتمام** آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۶+ هسته مرکزی



۱۴۰۳.۷.۳۰

نصب پنل

۱۴۰۳.۶.۳۱

○ آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) ضلع غربی


○ آغاز نصب پنل سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی

○ آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) هسته مرکزی

○ آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۵+ (کف ۱۶+) ضلع شرقی




شرح اجرا

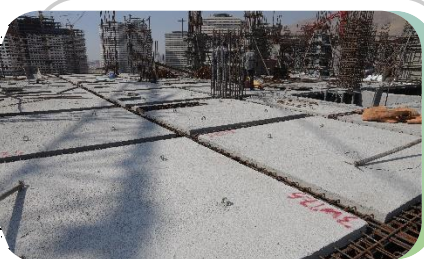

شرح اجرا



○ اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۵+ (کف ۱۶+) هسته مرکزی

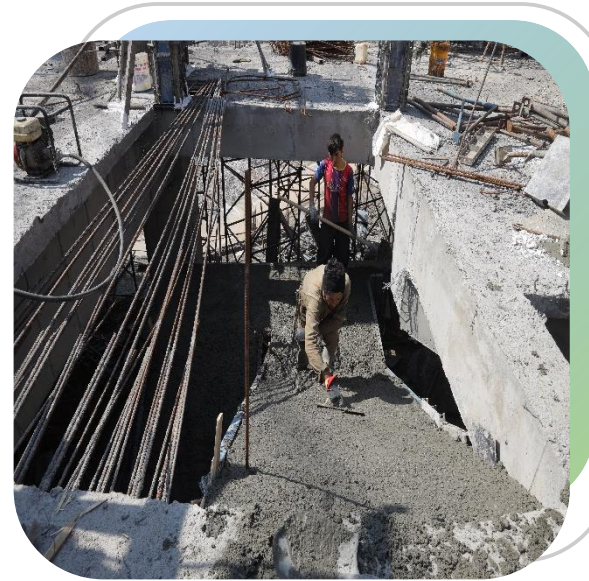

دیوار برشی و راه پله

- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۶ + ضلع غربی
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۷ + ضلع غربی
- **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۱۶ + ضلع شرقی
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ + به ۱۷ + شماره سه
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۵ + به ۱۶ + شماره دو
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۵ + به ۱۶ + شماره یک
- **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ + به ۱۷ + شماره چهار
- **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۷ + به ۱۸ + شماره چهار

✎ **شرح اجرا**




۱۴۰۳.۷.۳۰

واحد های مسکونی


۱۴۰۳.۶.۳۱



شرح اجرا

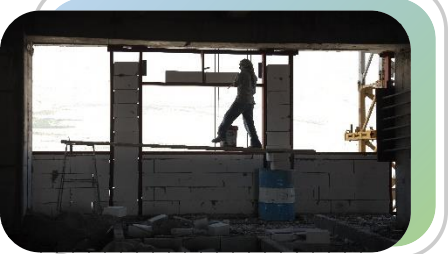


- اجرای ساخت و نصب وال پست جهت نصب ایزی وال در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۲+
- اتمام ساخت و نصب وال پست جهت نصب ایزی وال در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+
- اجرای نصب داکت کانال تهویه واحدهای مسکونی طبقات ۴+ الی ۷+
- آغاز نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- اجرای نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقه ۹+
- اتمام سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۲+ الی ۷+
- اجرای گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۵+

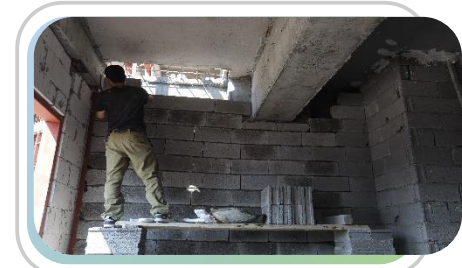

شرح اجرا






- اجرای ساخت و نصب وال پست جهت نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- اجرای نصب داکت کانال تهویه واحدهای مسکونی طبقات ۱+ الی ۳+
- اجرای نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+
- اجرای نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقه ۹+
- اجرای سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۳+ الی ۷+
- اجرای گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- اجرای نصب داکت کانال تهویه واحدهای مسکونی طبقات ۴+ الی ۵+

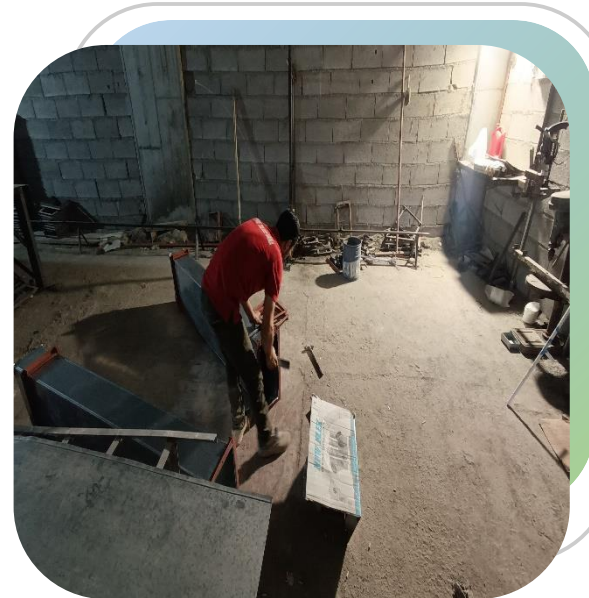

تاسیسات

- **اتمام** نصب لوله برق سقف و دیوار و قوطی کلید پریز واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- **اجرای** نصب لوله برق سقف و دیوار و قوطی کلید پریز واحدهای مسکونی طبقات ۵+ و ۶+
- **اتمام** شیارزنی جهت نصب لوله برق واحدهای مسکونی طبقه ۷+
- **اجرای** شیارزنی جهت نصب لوله برق واحدهای مسکونی طبقه ۸+
- **اتمام** نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- **اجرای** نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- **اتمام** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- **اجرای** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۷+

شرح اجرا

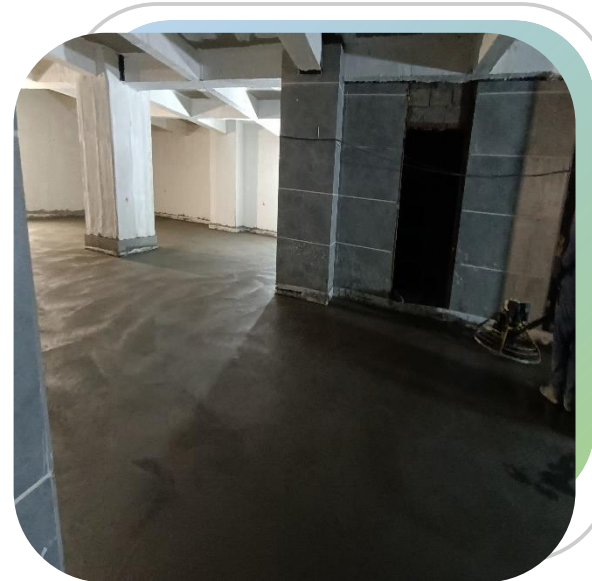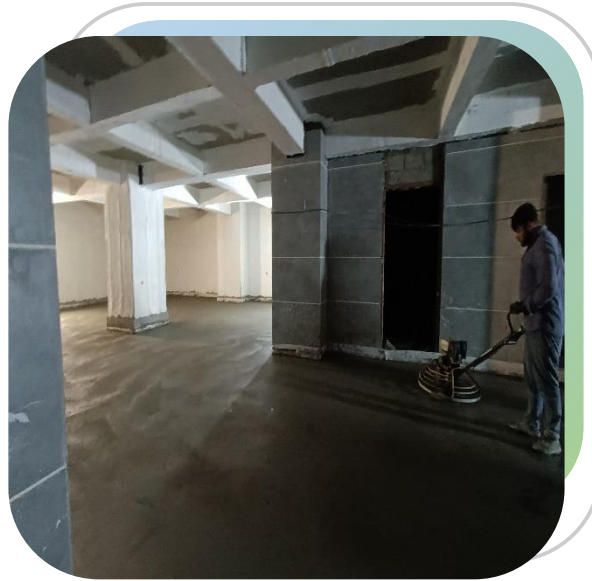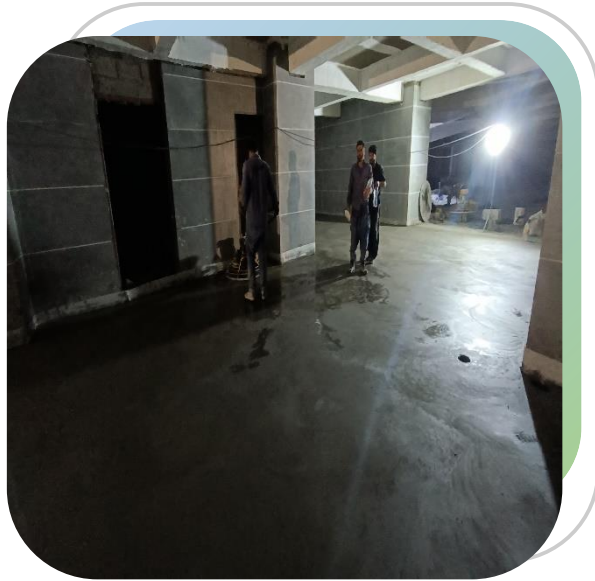

انباری ها و پارکینگ

○ **اتمام** اجرای بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- پارت آخر

شرح اجرا 

○ **اتمام** اجرای بتونه کاری دیوار و سقف پارکینگ طبقه ۲-




تخلیه بار

- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی
- ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودرسنگ ، گچ)
- ورود و تخلیه بار انواع میلگرد جهت اجرای سازه
- ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال
- ورود و تخلیه بار آهن آلات (نبشی ۱۵ ، ناودانی ۱۶ و قوطی ۱۴ و ۱۶) مورد استفاده جهت شاسی کشی آسانسور
- ورود و تخلیه بار بلوک هبلکس جهت اجرا در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی

شرح اجرا

۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)

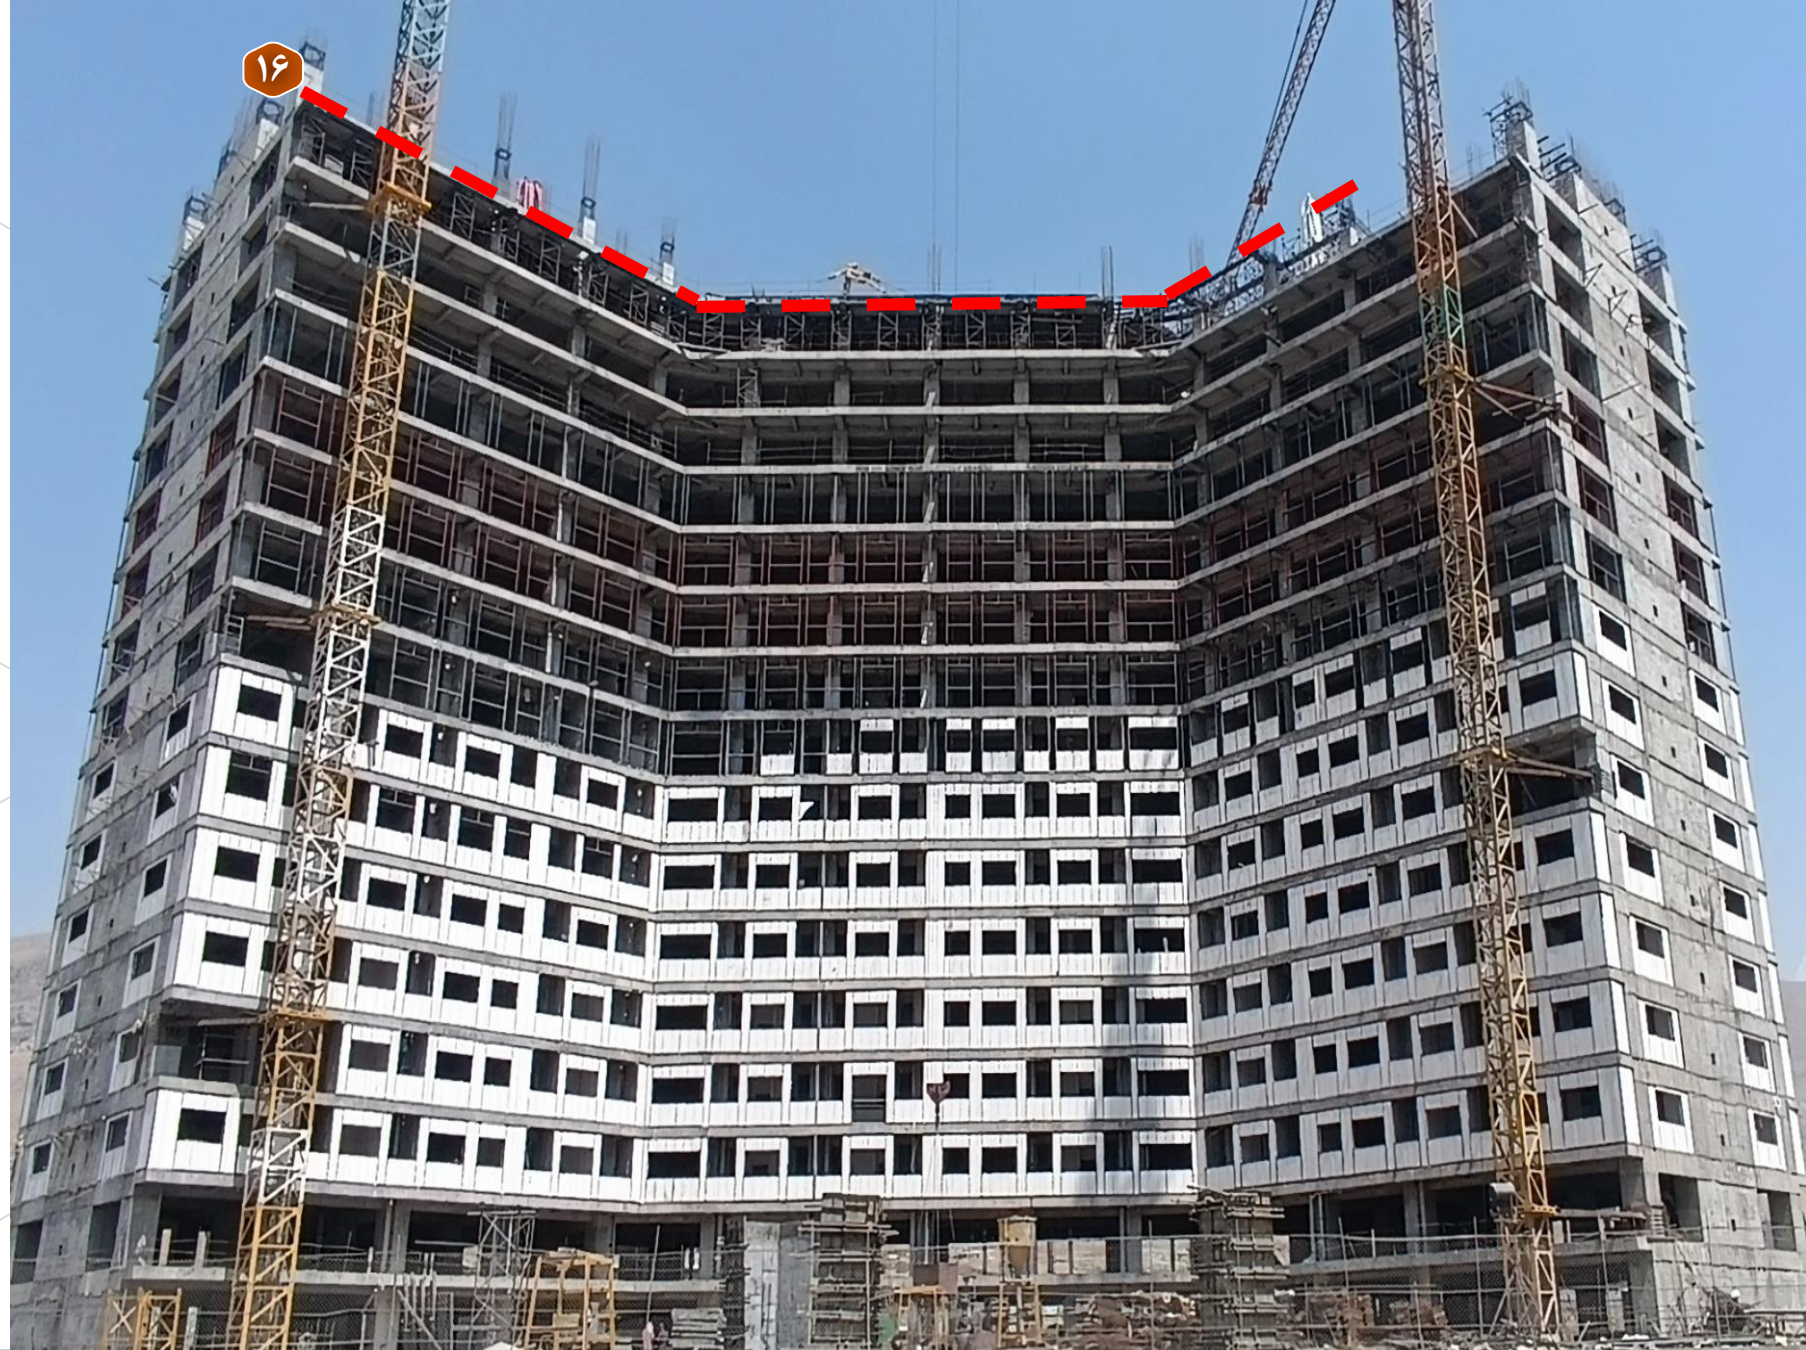

۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



