

بلوک N4

گزارش عملکرد ماهانه
مرداد ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۳.۵.۳۱

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۴.۳۱





- **اتمام** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۷ (کف +۱۸) ضلع غربی

- اجرای قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۷ (کف +۱۸) ضلع غربی

- **اتمام** قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۶ (کف +۱۷) ضلع شرقی

شرح اجرا

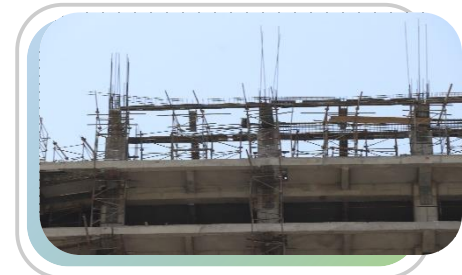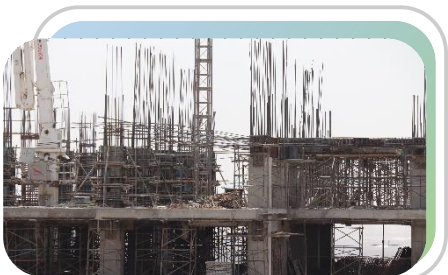

- اجرای آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۷ (کف +۱۸) ضلع غربی

- اجرای قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۶ (کف +۱۷) هسته مرکزی

- اجرای قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه +۱۶ (کف +۱۷) ضلع شرقی

شرح اجرا





۱۴۰۳.۵.۳۱


اجرای ستون

۱۴۰۳.۴.۳۱



○ اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۷ + هسته مرکزی

شرح اجرا 

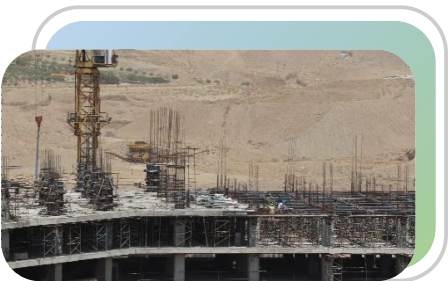


○ آغاز قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷ + هسته مرکزی



○ آغاز آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۷ + هسته مرکزی

شرح اجرا 

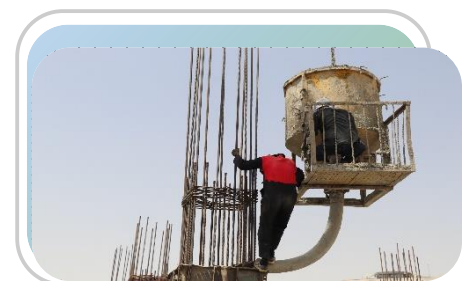

○ اتمام بتن ریزی ستون های طبقه ۱۶ + ضلع شرقی



۱۴۰۳.۵.۳۱


نصب پنل

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

○ **اتمام** نصب پنل سقف طبقه ۱۶ + (کف ۱۷) ضلع شرقی

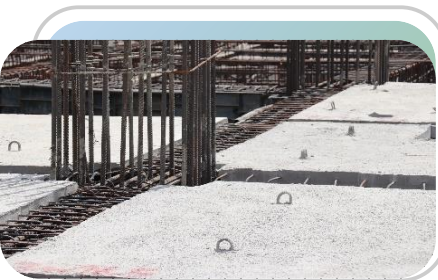

شرح اجرا

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۱۶ + (کف ۱۷) هسته مرکزی

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۱۶ + (کف ۱۷) ضلع شرقی





دیوار برشی راه پله

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ به ۱۷ + شماره یک

✎ **شرح اجرا**

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ به ۱۷ + شماره چهار




۱۴۰۳.۵.۳۱

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

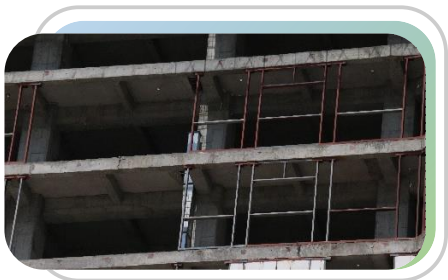


○ **آغاز** نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+


○ **آغاز** نصب سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۱+ الی ۴+

○ **آغاز** گچکاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۳+

○ **آغاز** اجرای کروم بندی جهت اجرای گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+

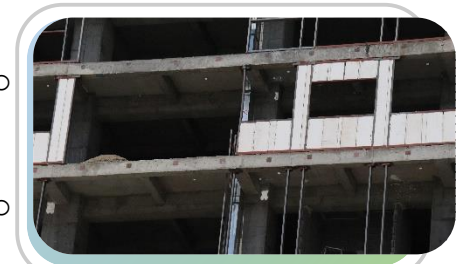

شرح اجرا

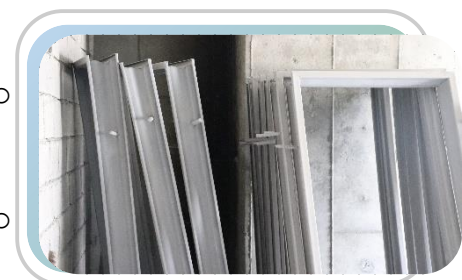


○ اجرای ساخت و نصب وال پست جهت اجرای پنل ایزی وال در قسمت واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+

○ اجرای نصب پنل پیش ساخته (ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۹+

○ اجرای نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقات ۶+ و ۷+

○ اجرای نصب کاشی سرامیک سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۳+

○ اجرای شیب بندی و قیرگونی کف سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۳+

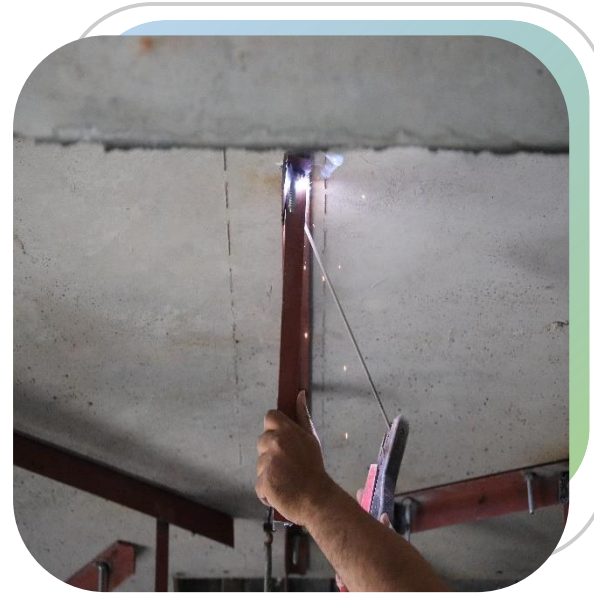

تاسیسات



- آغاز نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- اجرای نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقات ۵+
- آغاز نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقات ۶+
- اجرای شیارزنی دیوار جهت نصب لوله برق در واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- آغاز شیارزنی دیوار جهت نصب لوله برق در واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- اجرای نصب لوله های برق دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- آغاز نصب لوله های برق دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۵+

✎ شرح اجرا



انباری ها و پارکینگ

○ آغاز و اتمام عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- پارت چهارم و پنجم

شرح اجرا

○ اجرای موزائیک کاری کف انباری های پارکینگ طبقه ۴-



تخلیه بار

○ ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی

○ ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودرسنگ ، گچ)

○ ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی

○ ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال

✎ شرح اجرا

۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



