

بلوک N4

گزارش عملکرد ماهانه
مهر ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com




۱۴۰۳.۷.۳۰

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۶.۳۱



شرح اجرا

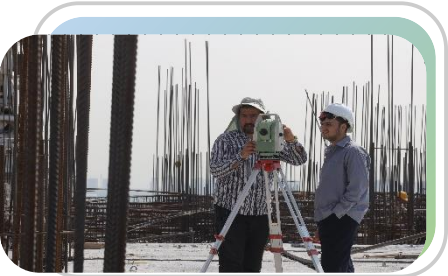

- **اتمام** قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی
- **آغاز و اتمام** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) هسته مرکزی
- **آغاز** قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) هسته مرکزی
- **آغاز و اتمام** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) ضلع شرقی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی و ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع شرقی



شرح اجرا



- اجرای قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی



۱۴۰۳.۷.۳۰

اجرای ستون

۱۴۰۳.۶.۳۱



- **آغاز** آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۱۸+ ضلع غربی
- **اتمام** قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷+ هسته مرکزی

شرح اجرا



- **آغاز** آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۸+ هسته مرکزی
- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷+ ضلع شرقی



- **اتمام** آرماتوربندی ستون های طبقه ۱۷+ هسته مرکزی

شرح اجرا



- اجرای قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱۷+ هسته مرکزی



۱۴۰۳.۷.۳۰

نصب پنل

۱۴۰۳.۶.۳۱




○ آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع غربی

○ آغاز نصب پنل سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) هسته مرکزی


○ آغاز و اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۷+ (کف ۱۸+) ضلع شرقی



شرح اجرا

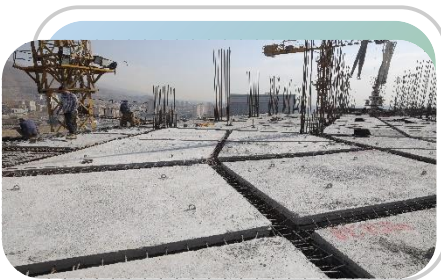

○ اتمام نصب پنل سقف طبقه ۱۶+ (کف ۱۷+) هسته مرکزی

شرح اجرا

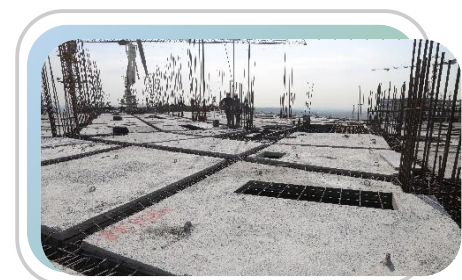

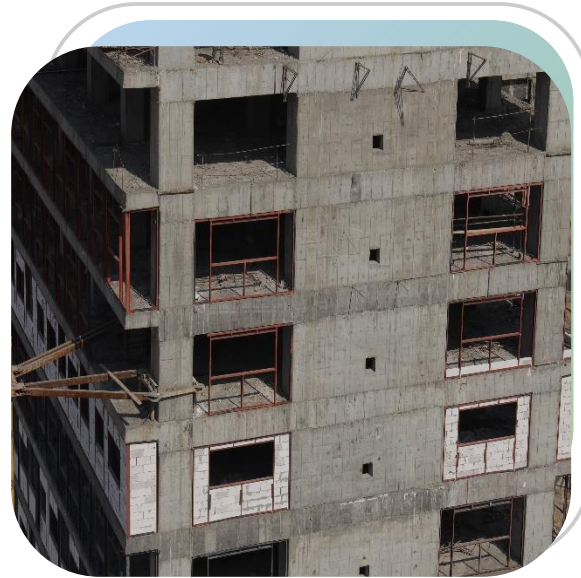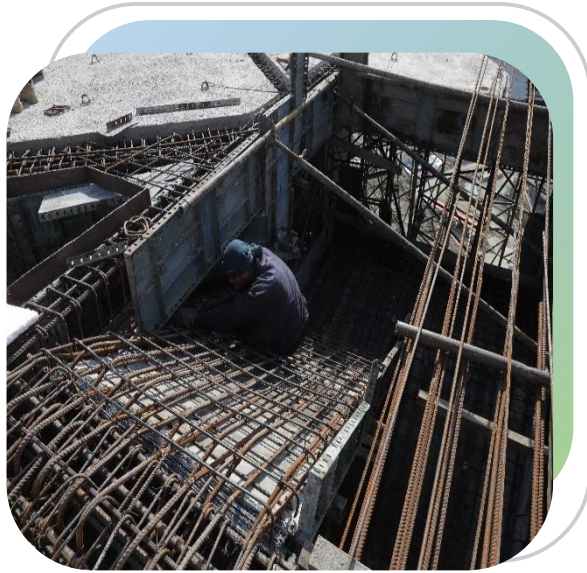

دیوار برشی راه پله

- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۷ + ضلع غربی
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۱۷ + ضلع شرقی
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۷ + به ۱۸ + شماره یک
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ + به ۱۷ + شماره سه
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۶ + به ۱۷ + شماره دو
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۷ + به ۱۸ + شماره چهار

✎ **شرح اجرا**




۱۴۰۳.۷.۳۰

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۶.۳۱



شرح اجرا






- آغاز نصب وال پست جهت اجرای بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۲+
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقات ۱۰+ و ۱۱+
- آغاز گچکاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- اتمام نصب سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۱+ الی ۷+ ضلع شرقی
- آغاز شیب بندی و پلاستر سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- اجرای کاشی سرامیک دیوار آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۳+



شرح اجرا




- اجرای نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۰+
- اجرای نصب سرامیک دیوار راه پله واحدهای مسکونی طبقات ۱+ الی ۴+
- اجرای گچکاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۳+
- اجرای کروم بندی جهت اجرای گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+

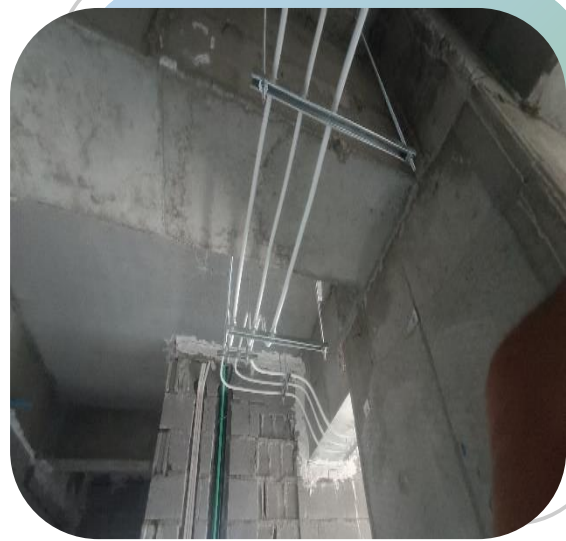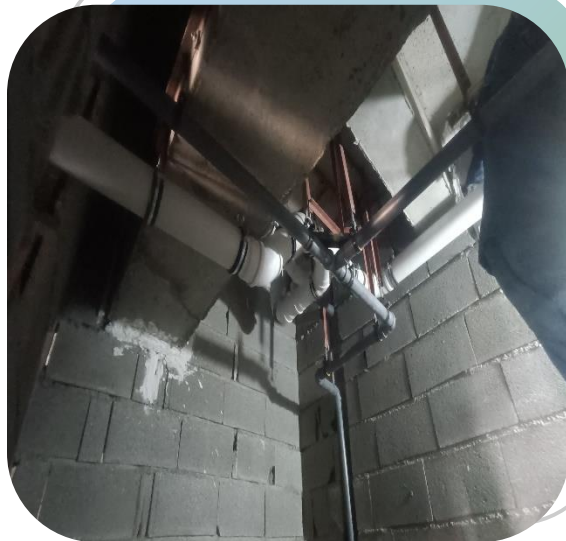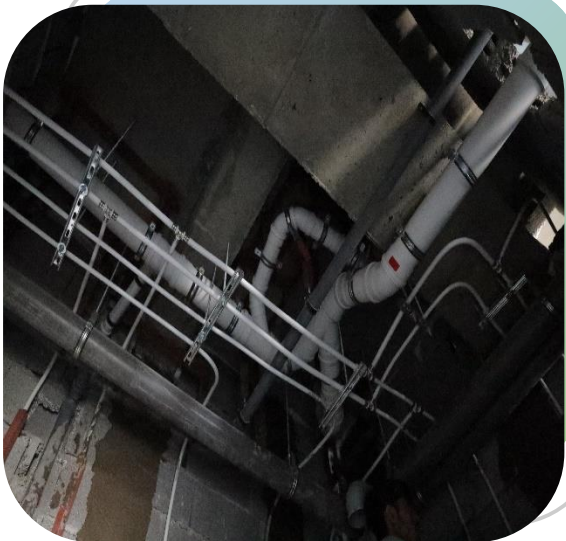

تاسیسات

- اجرای نصب لوله های آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- **اتمام** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- اجرای نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- **آغاز** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۷+
- **اتمام** شیارزنی دیوار جهت نصب لوله برق در واحدهای مسکونی طبقات ۵+ و ۶+
- **آغاز** شیارزنی دیوار جهت نصب لوله برق در واحدهای مسکونی طبقه ۸+
- **اتمام** نصب لوله های برق دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- اجرای نصب لوله های برق دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۵+
- **آغاز** نصب لوله های برق دیوار و سقف واحدهای مسکونی طبقه ۶+

✎ شرح اجرا

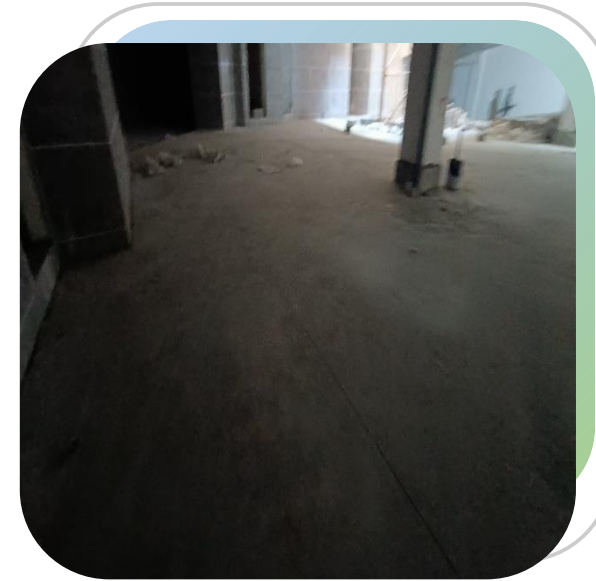

انباری ها و پارکینگ



- آغاز و اتمام عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۲- پارت هفتم
- اتمام بتن ریزی بخش پایانی سقف موتورخانه ضلع جنوب شرقی
- اتمام موزائیک کاری کف انباری های پارکینگ طبقه ۴-

شرح اجرا 



تخلیه بار

- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی
- ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودرسنگ ، گچ)
- ورود و تخلیه بار انواع میلگرد جهت اجرای سازه
- ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال
- ورود و تخلیه بار آهن آلات (نبشی ۱۵ ، ناودانی ۱۶ و قوطی ۱۴ و ۱۶) مورد استفاده جهت شاسی کشی آسانسور
- ورود و تخلیه بار بلوک هبلکس جهت اجرا در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی

شرح اجرا

۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



