

# بلوک N5

گزارش عملکرد ماهانه  
مرداد ماه ۱۴۰۳

امران  
آبشار  
اسیادانا



مجتمع مسکونی  
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر  
[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)





۱۴۰۳.۵.۳۱

## اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۴.۳۱



### شرح اجرا



- آغاز و اتمام آرماتوربندی و آغاز قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۰+ (کف ۲۱+) ضلع غربی

- اتمام قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۹+ (کف ۲۰+) هسته مرکزی

- اتمام قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۹+ (کف ۲۰+) ضلع شرقی



### شرح اجرا



- اجرای قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۹+ (کف ۲۰+) هسته مرکزی

- اجرای قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۱۹+ (کف ۲۰+) ضلع شرقی





۱۴۰۳.۵.۳۱

## اجرای ستون

۱۴۰۳.۴.۳۱




شرح اجرا

○ **اتمام** بتن ریزی ستون های طبقه ۲۰+ ضلع غربی


○ **آغاز** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۰+ هسته مرکزی

○ **آغاز** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۰+ ضلع شرقی

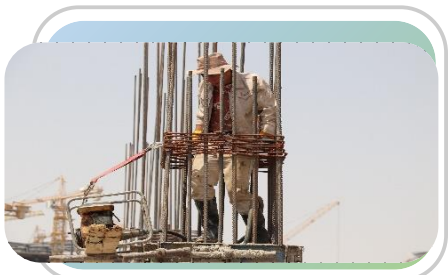

شرح اجرا

○ اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۲۰+ ضلع غربی

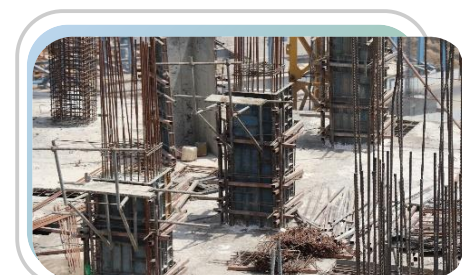






۱۴۰۳.۵.۳۱


## نصب پنل

۱۴۰۳.۴.۳۱

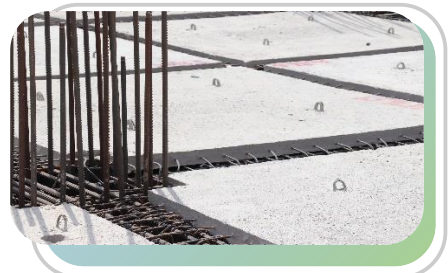

شرح اجرا

○ **اتمام** نصب پنل سقف طبقه ۱۹ + (کف ۲۰) هسته مرکزی

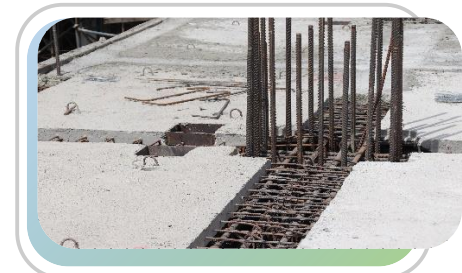


شرح اجرا

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۱۹ + (کف ۲۰) هسته مرکزی

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۱۹ + (کف ۲۰) ضلع شرقی





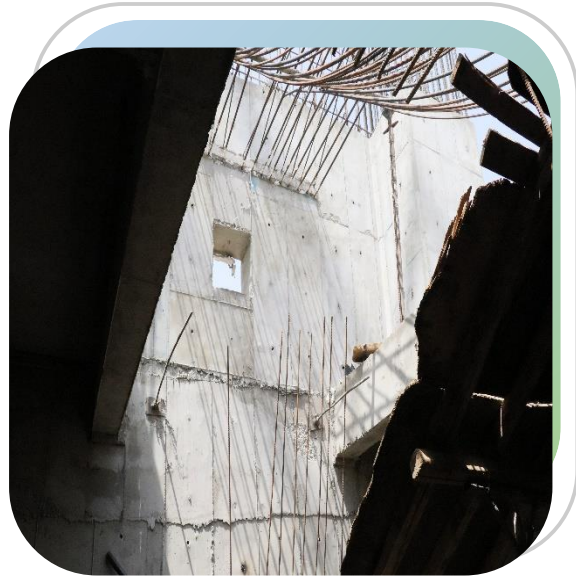

## دیوار برشی و راه پله

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۹+ به ۲۰+ شماره چهار

✎ **شرح اجرا**

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۱۹+ به ۲۰+ شماره یک







۱۴۰۳.۵.۳۱

## واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۴.۳۱




### شرح اجرا

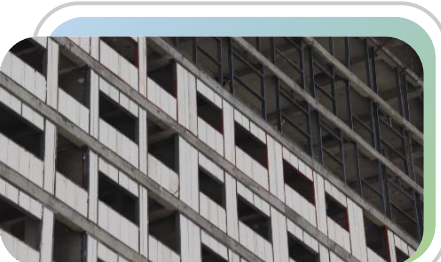

- آغاز ساخت و نصب وال پست (جهت نصب دیوار ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۱۵+ و ۱۶+
- آغاز نصب پنل ایزی وال قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات ۱۴+ و ۱۵+
- آغاز گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۶+
- آغاز نصب سرامیک کف پذیرایی واحدهای مسکونی طبقه ۴+
- آغاز نصب چهارچوب درب واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- آغاز سرامیک کاری کف پذیرایی واحدهای مسکونی طبقه ۵+





### شرح اجرا

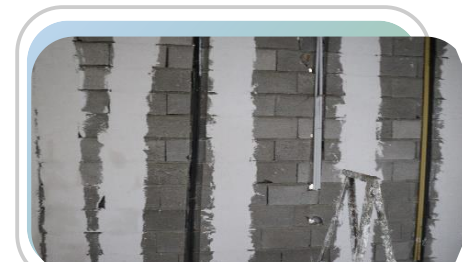

- اجرای تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۱۶+
- اجرای ساخت و نصب وال پست (جهت نصب دیوار ایزی وال) در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه ۱۴+
- اجرای نصب چهارچوب درب واحدهای مسکونی طبقات ۹+ و ۱۰+




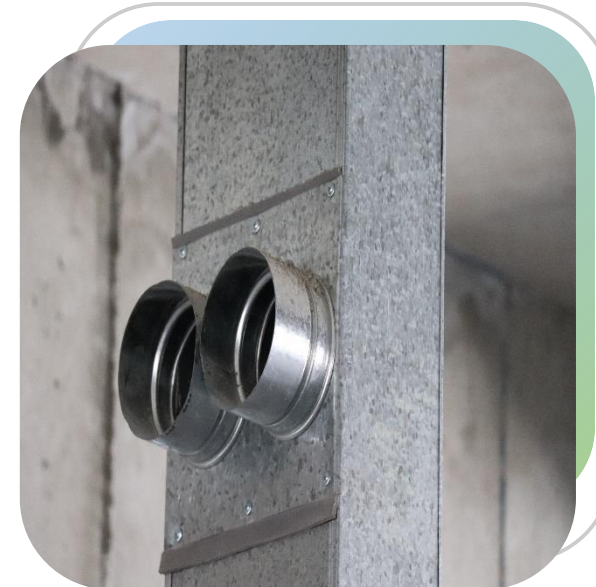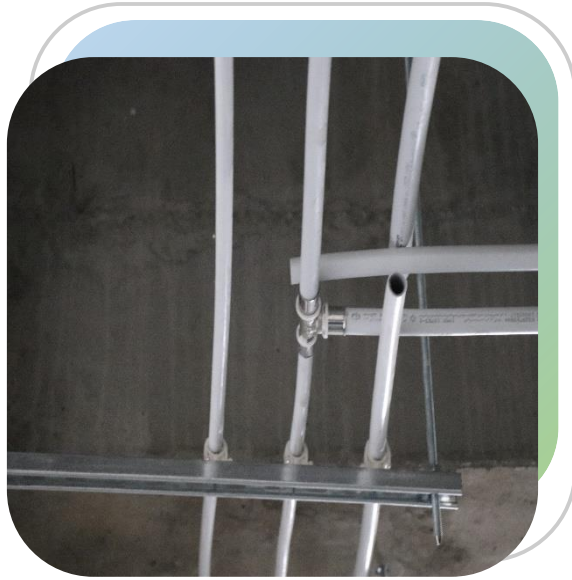

# تاسیسات

- اجرای نصب لوله برق دیواری و سقفی واحدهای مسکونی طبقات ۶+ و ۷+ و ۸+
- اجرای نصب لوله های تاسیساتی آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه ۸+
- **آغاز** نصب داکت کانال های تهویه در واحدهای مسکونی طبقه ۱۱+
- اجرای نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۷+
- اجرای شیار زنی جهت نصب لوله برق دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۸+

## شرح اجرا

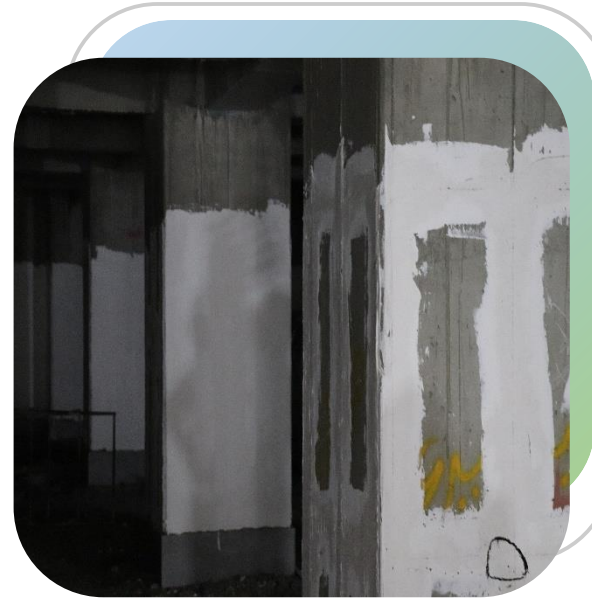

## انباری ها و پارکینگ




○ **اتمام** بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۴ - **پارت پنجم**

**شرح اجرا** 

○ اجرای بتونه کاری دیوار و سقف پارکینگ طبقه ۴ -



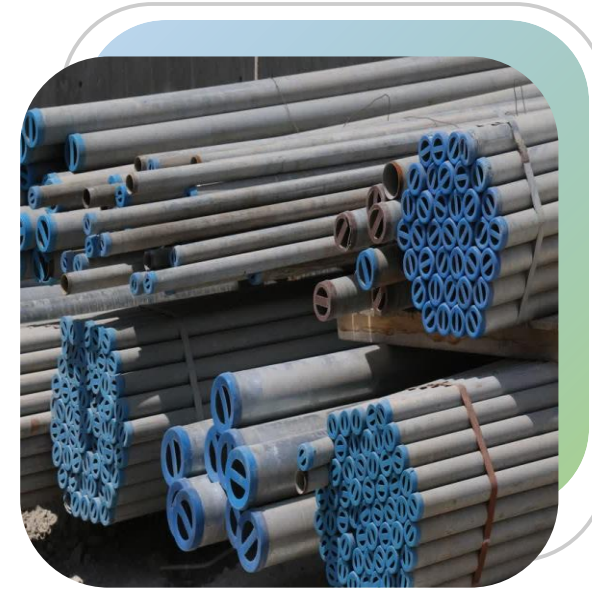

# تخلیه بار

○ ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی

○ ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودر سنگ ، گچ)

✎ **شرح اجرا** ○ ورود و تخلیه بار انواع میلگرد جهت اجرای سازه

○ ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی

○ ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال



۱۴۰۳.۴.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)





۱۴۰۳.۵.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)





۱۴۰۳.۴.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)





۱۴۰۳.۵.۳۱

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)





