

بلوک N6

گزارش عملکرد ماهانه
مرداد ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com



۱۴۰۳.۵.۳۱

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا



- **آغاز** آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۳+ (کف ۲۴+) ضلع شرقی
- **اتمام** قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۲+ (کف ۲۳+) هسته مرکزی
- **آغاز** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۳+ (کف ۲۴+) هسته مرکزی
- **آغاز و اتمام** قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۲+ (کف ۲۳+) ضلع غربی



شرح اجرا



- **اتمام** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۲+ (کف ۲۳+) هسته مرکزی
- **آغاز** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۲+ (کف ۲۳+) هسته مرکزی
- **اتمام** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۲+ (کف ۲۳+) ضلع غربی



۱۴۰۳.۵.۳۱

اجرای ستون

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

○ **آغاز** آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۳+ ضلع شرقی

○ **آغاز و اتمام** آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۳+ هسته مرکزی

○ **آغاز** آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۳+ ضلع غربی



شرح اجرا

○ اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۲۳+ ضلع شرقی

○ **آغاز** قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۳+ ضلع شرقی

○ **اتمام** بتن ریزی ستون های طبقه ۲۲+ ضلع غربی





۱۴۰۳.۵.۳۱

نصب پنل

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

○ آغاز نصب پنل سقف طبقه ۲۳ + (کف ۲۴) ضلع شرقی

○ اتمام نصب پنل سقف طبقه ۲۲ + (کف ۲۳) هسته مرکزی


○ اتمام نصب پنل سقف طبقه ۲۲ + (کف ۲۳) ضلع غربی





شرح اجرا

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۲۲ + (کف ۲۳) هسته مرکزی

○ آغاز نصب پنل سقف طبقه ۲۲ + (کف ۲۳) ضلع غربی

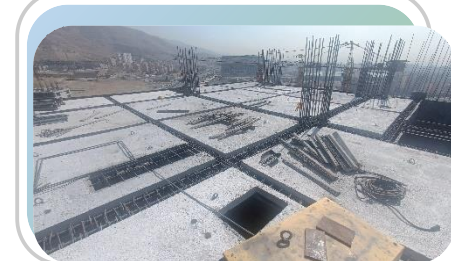

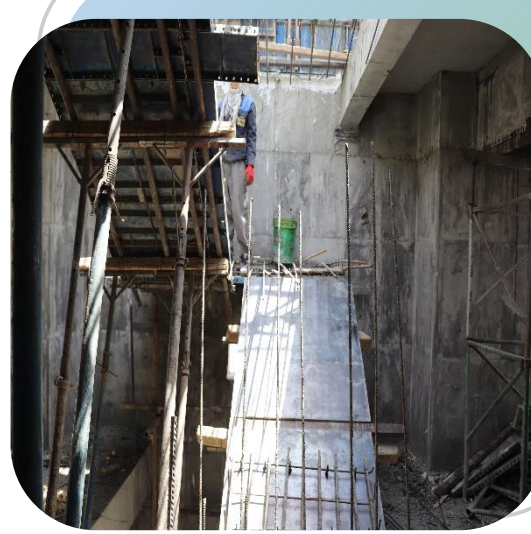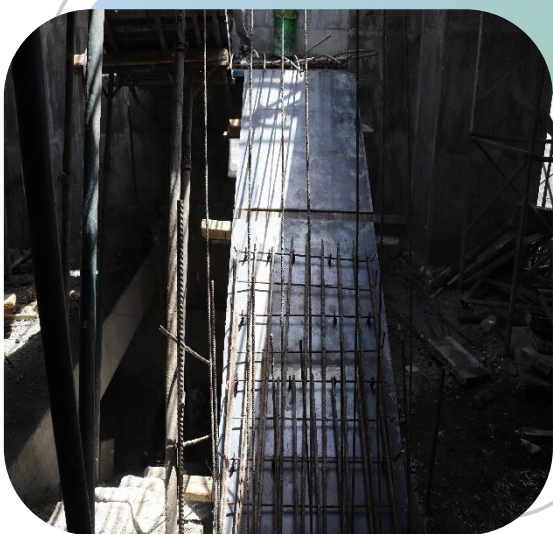

دیوار برشی و راه پله



○ **اتمام** قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۲۳ + ضلع شرقی

○ **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۲۱ + به ۲۲ + شماره ۳ **شرح اجرا** ✎

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۲۱ + به ۲۲ + شماره ۴



۱۴۰۳.۵.۳۱

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۴.۳۱



شرح اجرا

○ آغاز تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۱۹+


○ اتمام شیب بندی و عایق بندی کف سرویس و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه ۴+


○ آغاز نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقه ۱۷+



شرح اجرا

○ اجرای تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه ۱۸+

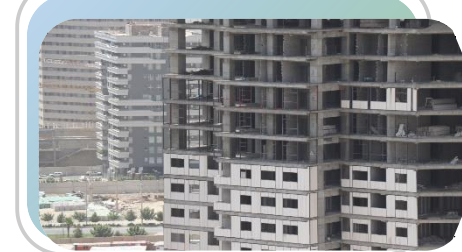

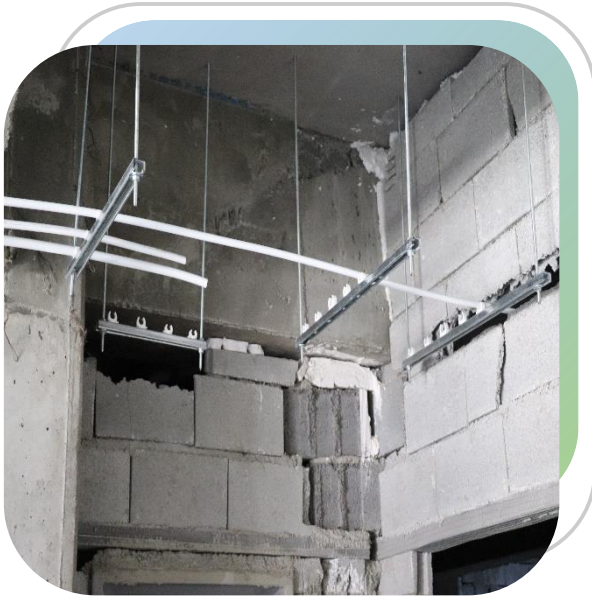

تاسیسات

○ اجرای شیار زنی دیوار و نصب قوطی کلید پریز برق واحدهای مسکونی طبقه ۷+


○ اجرای نصب لوله آب گرم و سرد واحدهای مسکونی در طبقه ۷+

○ اجرای نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۶+

○ **آغاز** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۷+

○ **آغاز** نصب لوله های برق دیوار و سقف واحدهای مسکونی طبقه ۷+

شرح اجرا

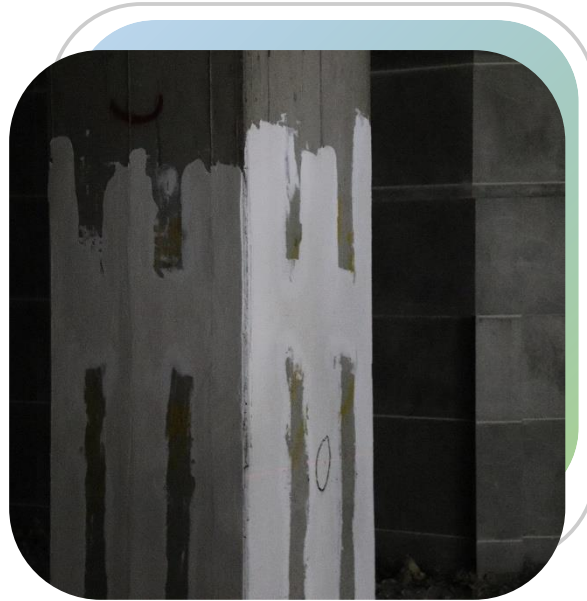


انباری ها و پارکینگ

○ اجرای بتونه کاری دیوار و سقف پارکینگ طبقه ۵+ جهت اجرای رنگ

شرح اجرا 

○ اتمام بتن ریزی کف پارکینگ طبقه ۴- پارت ۵

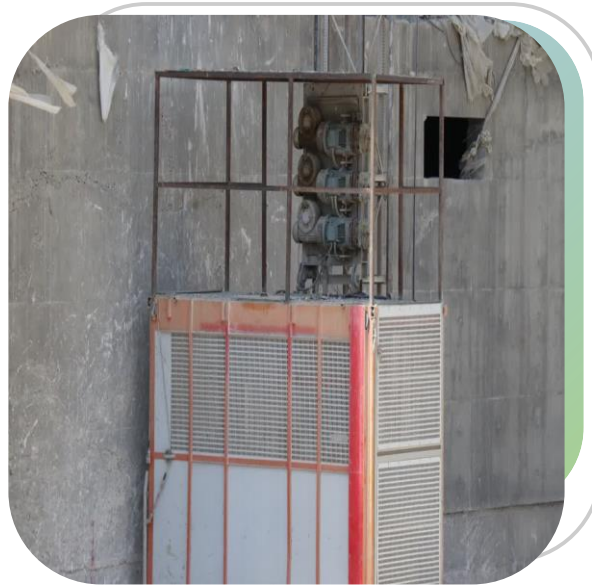

تخلیه بار

- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحد های مسکونی
- ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان ، ماسه ، پودر سنگ ، گچ)
- ورود و تخلیه بار انواع میلگرد جهت اجرای سازه
- ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال

شرح اجرا

۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۴.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۵.۳۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



