

بلوک D2




گزارش عملکرد ماهانه
آبان ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com

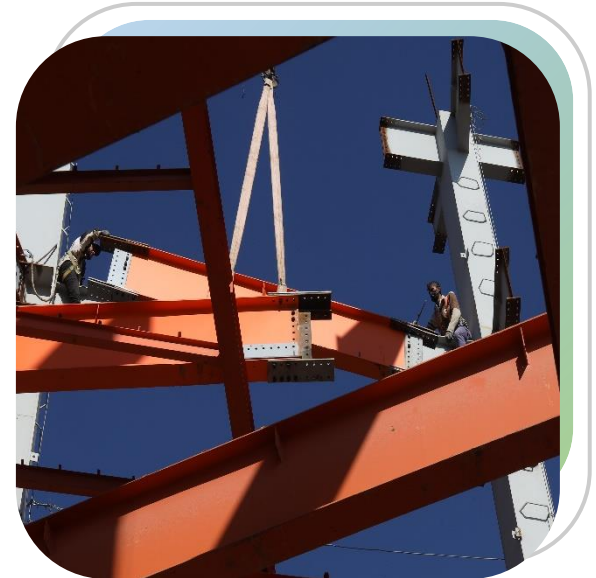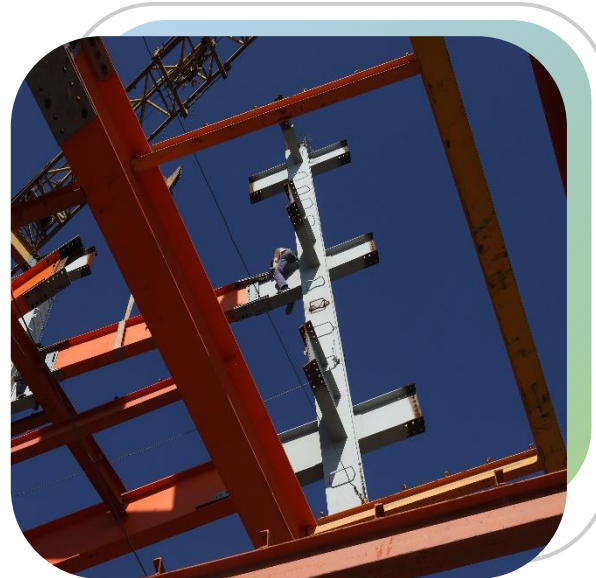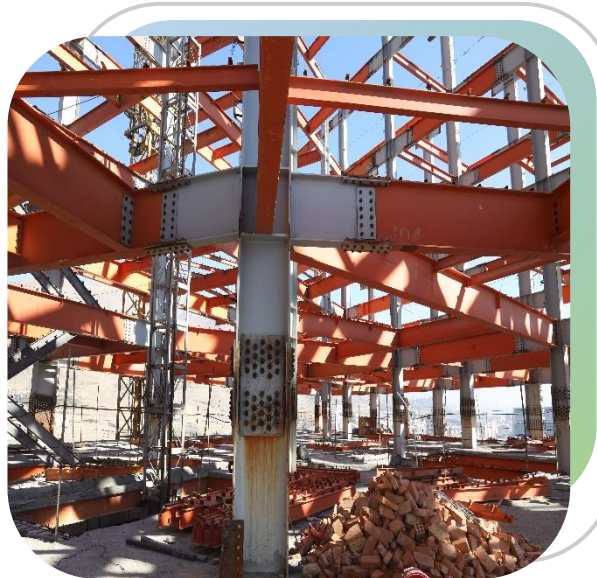

نصب تیر و ستون

✎ شرح اجرا ○ ادامه اجرای نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی



۱۴۰۳،۰۸،۳۰

واحد های مسکونی



۱۴۰۳،۰۷،۳۰



شرح اجرا







- ادامه اجرای نصب ورق های آلومینیوم 3D و اجرای نما در بال شرقی
- **آغاز** نصب ورق های آلومینیوم 3D و اجرای نما در بال غربی
- **آغاز** نصب فریم پنجره واحدهای مسکونی در بال شرقی و بال غربی
- ادامه اجرای زیر سازی جهت اجرای نما در بال شرقی و بال غربی
- اجرای نصب داربست جهت اجرای نما
- ادامه اجرای سرامیک کاری سرویس ها و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه **۷+** و **۸+** بال شرقی و بال غربی
- **آغاز** سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی طبقه **۸+** در بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و عایق کاری سرویس ها و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه **۹+** و **۱۰+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای کفسازی واحدهای مسکونی طبقه **۸+** و **۹+** بال شرقی
- اجرای گچکاری (گچ زیرکار) طبقه **۱۲+** بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه **۱۶+** و **۱۷+** بال غربی و بال شرقی
- **اتمام تیغه چینی دیوار های پیرامونی بال غربی**



شرح اجرا



- **آغاز** نصب ورق های کامپوزیت و اجرای نما در بال شرقی
- ادامه اجرای زیر سازی جهت اجرای نما در بال شرقی و بال غربی
- ادامه اجرای نصب داربست جهت اجرای نما
- اجرای سرامیک کاری سرویس ها و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه **۷+** و **۸+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای شیب بندی و عایق کاری سرویس ها و آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه **۸+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای کفسازی واحدهای مسکونی طبقه **۸+** الی **۱۰+** بال غربی
- ادامه سرامیک کاری کف واحد های مسکونی طبقه **۷+** بال شرقی و بال غربی
- ادامه گچکاری (گچ زیرکار) طبقه **۸+** الی **۱۱+** بال شرقی و بال غربی
- اجرای کروم بندی جهت اجرای گچکاری طبقه **۱۱+** الی **۱۵+** بال شرقی و بال غربی
- **اتمام** تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه **۱۵+** بال شرقی
- ادامه تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه **۱۶+** و **۱۷+** بال غربی
- **آغاز و اتمام** نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه **۲۷+** و **۲۸+** بال غربی
- اتمام تیغه چینی دیوار های پیرامونی طبقه **۲۴+** بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه **۲۵+** و **۲۸+** بال غربی

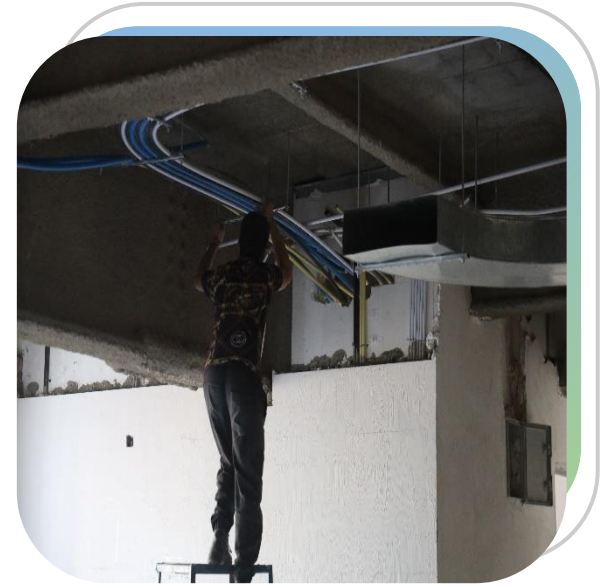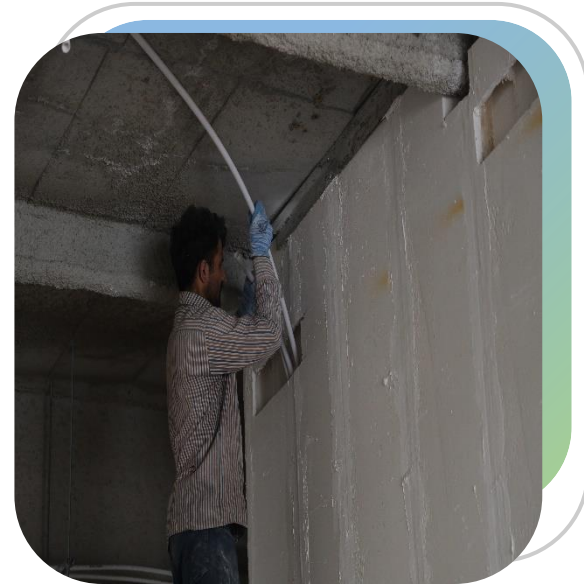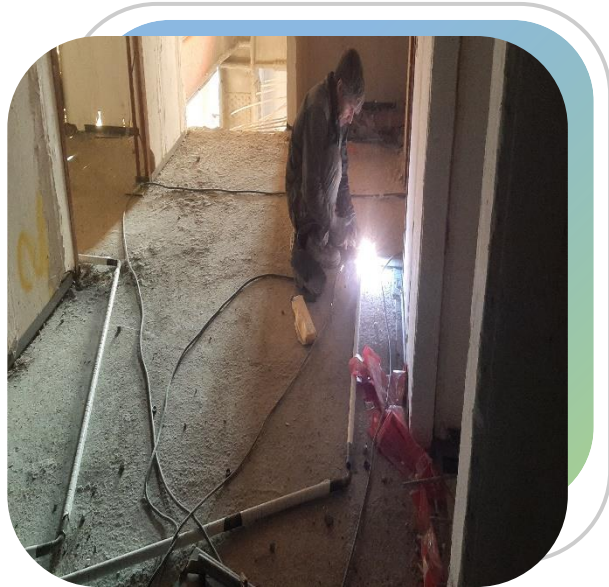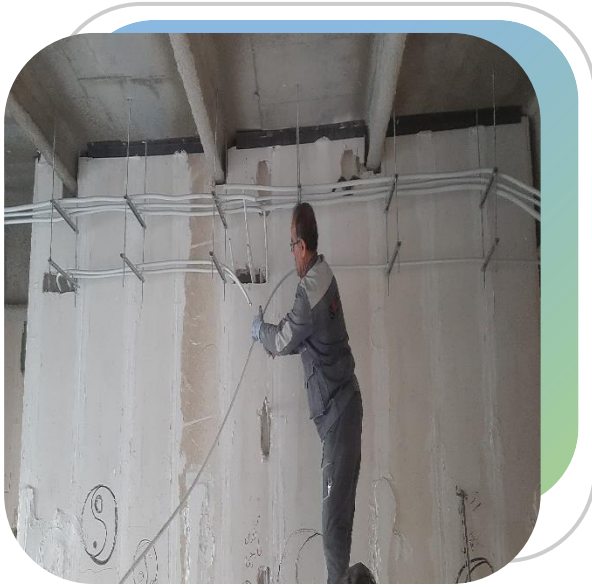


تاسیسات



- اجرای نصب قوطی کلید و پریز طبقه ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی گاز طبقه ۱۳+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی دیواری برق طبقه ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- ادامه اجرای لوله کشی سقفی برق طبقه ۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی پوشفیت طبقه ۱۴+ و ۱۵+ بال شرقی و بال غربی
- اجرای لوله کشی پنج لایه (آبرسانی) طبقه ۱۵+ بال غربی و بال شرقی


شرح اجرا

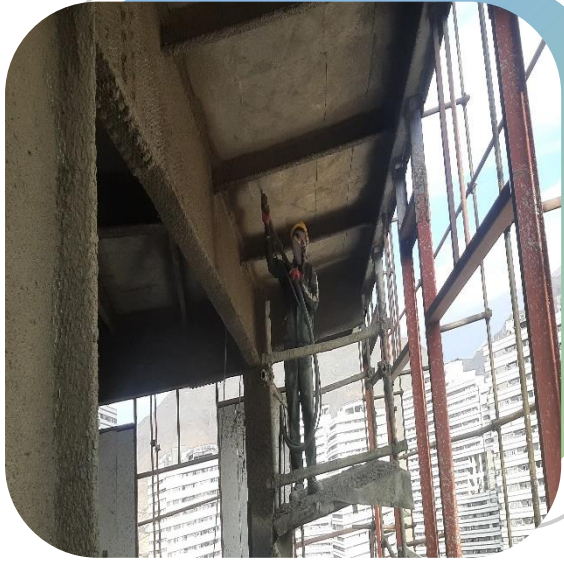

ضد حریق





- **شرح اجرا** اتمام زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه ۲۸+ بال غربی
- **اتمام** پاشش ضد حریق واحدهای مسکونی در بال غربی

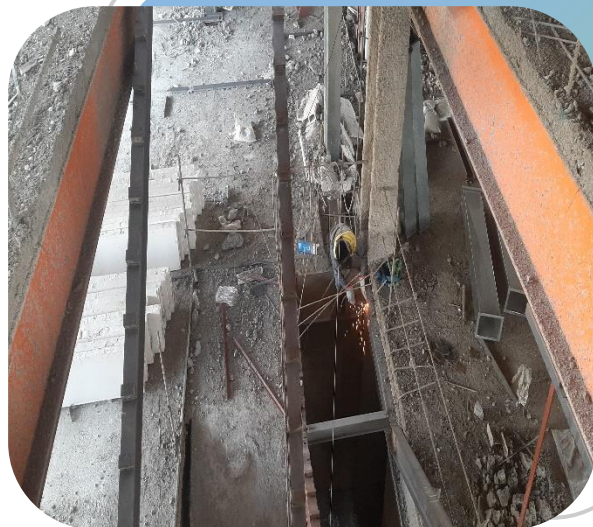

راه پله ها


شرح اجرا ○ ادامه اجرای ساخت و نصب ستونک ها و شمشیری های راه پله ها

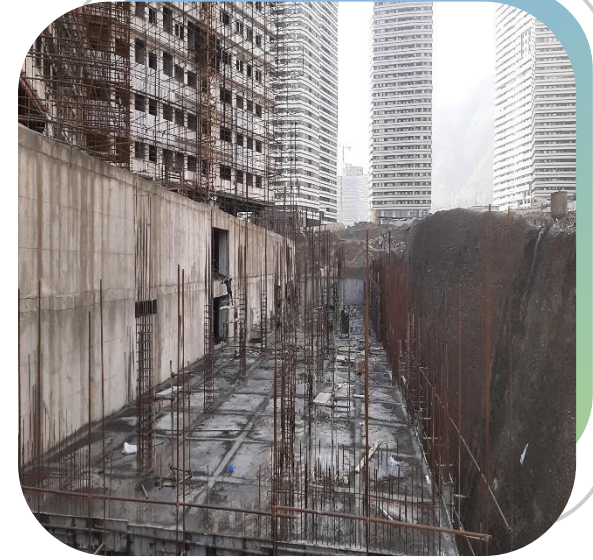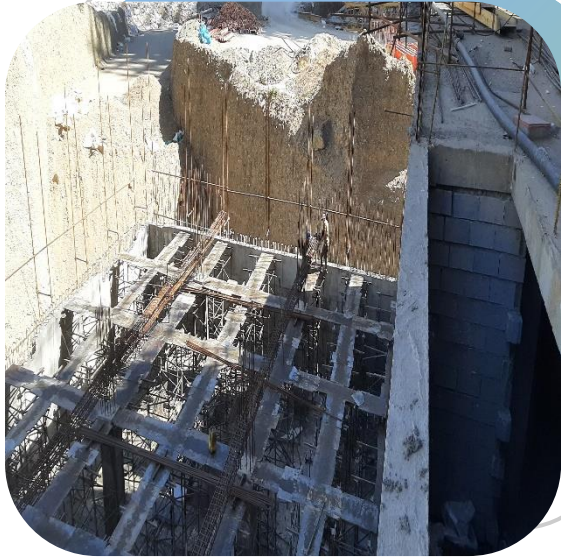

پارکینگ الحاقی

- اتمام قالب بندی ، آرماتور بندی ، و نصب پنل های بتنی و بتن ریزی تیرهای اصلی سقف طبقه ۳- (پارت سوم)
- اجرای آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل شمالی و ستون های طبقه ۲- (پارت دوم)

شرح اجرا

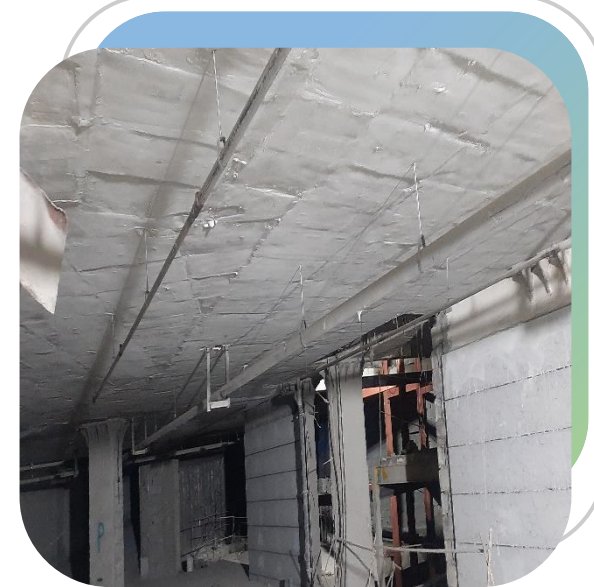

پارکینگ و انباری ها

✎ شرح اجرا ○ اجرای ساب زنی و بتونه کاری سقف پارکینگ طبقه ۱- و ۵- جهت پاشش رنگ و اپوکسی



تخلیه بار



- ورود و تخلیه تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی
- ورود و تخلیه پنل پیش ساخته (ایزی وال) جهت اجرا در طبقات مسکونی
- ورود و تخلیه سرامیک در محل پروژه
- ورود و تخلیه مصالح (سیمان، ماسه، سیمان سفید، گچ، مواد ضدحریق)

شرح اجرا

۱۴۰۳،۰۷،۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳،۰۸،۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳،۰۷،۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳،۰۸،۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



