

بلوک N6

گزارش عملکرد ماهانه
آبان ماه ۱۴۰۳

امران
آبشار
اسیادانا



مجتمع مسکونی
بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar.com



۱۴۰۳.۸.۳۰

اجرای تیر سقف

۱۴۰۳.۷.۳۰



شرح اجرا

- **آغاز و اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و **آغاز** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۵+ (کف ۲۶+) ضلع شرقی

- **اتمام** قالب بندی و **آغاز و اتمام** بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) هسته مرکزی

- **آغاز** آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۵+ (کف ۲۶+) هسته مرکزی

- **اتمام** آرماتوربندی و **آغاز و اتمام** تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) ضلع غربی



شرح اجرا

- اجرای قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) هسته مرکزی

- اجرای آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) ضلع غربی





۱۴۰۳.۸.۳۰

اجرای ستون

۱۴۰۳.۷.۳۰




شرح اجرا

○ **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۵+ ضلع شرقی

○ **آغاز** آرماتوربندی ستون های طبقه ۲۶+ ضلع شرقی


○ **آغاز** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۲۵+ هسته مرکزی

○ **آغاز** آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲۵+ ضلع غربی

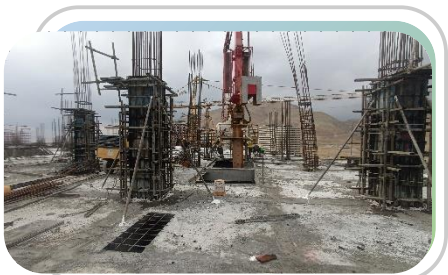

شرح اجرا

○ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲۵+ ضلع شرقی

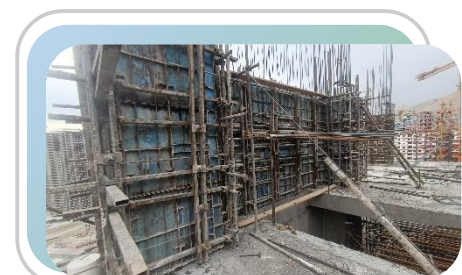



۱۴۰۳.۸.۳۰

نصب پنل

۱۴۰۳.۷.۳۰



○ **آغاز** نصب پنل سقف طبقه ۲۵+ (کف ۲۶+) ضلع شرقی

○ **اتمام** نصب پنل سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) هسته مرکزی

○ **آغاز و اتمام** نصب پنل سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) ضلع غربی

شرح اجرا



شرح اجرا

○ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۲۴+ (کف ۲۵+) هسته مرکزی





دیوار برشی و راه پله

- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۲۵+ ضلع شرقی
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۲۵+ ضلع غربی
- **اتمام** آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۲۴+ به ۲۵+ شماره ۱
- **اتمام** آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۲۳+ به ۲۴+ شماره ۴

✎ **شرح اجرا**



۱۴۰۳.۸.۳۰

واحد های مسکونی

۱۴۰۳.۷.۳۰




شرح اجرا





- آغاز تیغه چینی دیوار واحدهای مسکونی طبقه +۲۱
- اجرای نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقات +۱۱ الی +۱۳
- آغاز نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات +۱۴ و +۱۵
- آغاز اجرای وال پست جهت نصب هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقات +۱۵ الی +۱۸
- آغاز گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه +۸
- اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه +۷



شرح اجرا

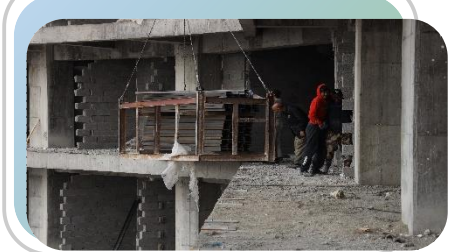

- اتمام نصب چهارچوب فرانسوی درب اتاق و سرویس واحدهای مسکونی طبقات +۹ و +۱۰
- اجرای نصب بلوک هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه +۱۳
- اجرای اجرای وال پست جهت نصب هبلکس در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی طبقه +۱۴

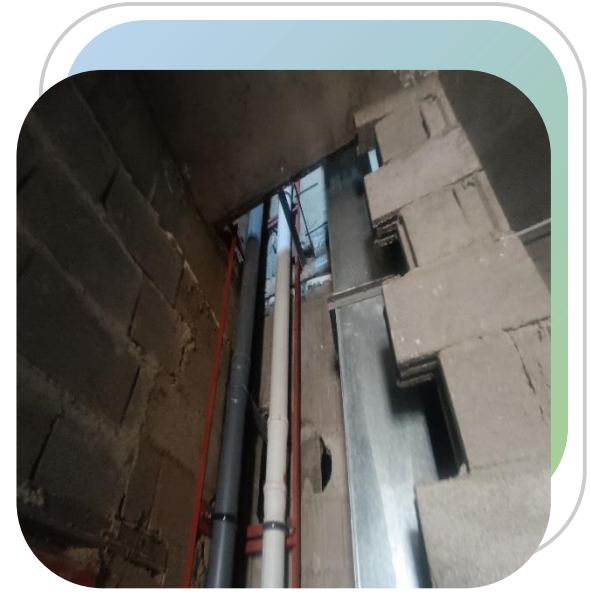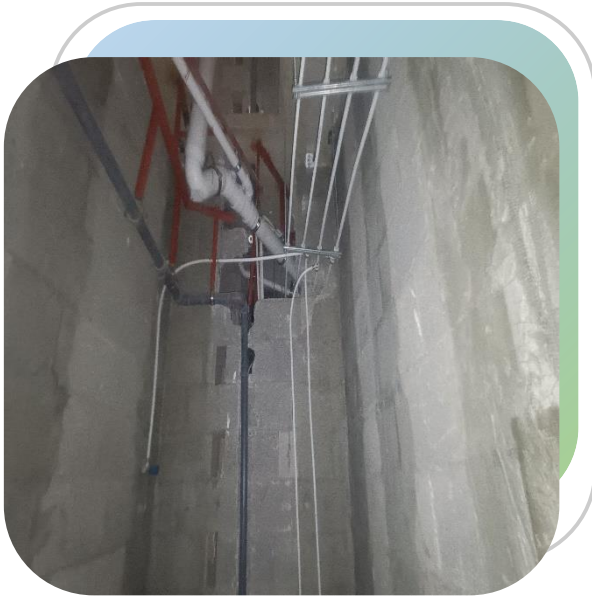

تاسیسات



- **آغاز** نصب لوله آب گرم و سرد واحد های مسکونی در طبقه ۸+
- **آغاز** نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه ۸+
- اجرای ساخت کانال های تهویه جهت نصب در واحدهای مسکونی
- اجرای نصب لوله های برق دیوار و سقف واحدهای مسکونی طبقه ۷+
- داربست بندی و اجرای شاسی کشی آسانسور طبقات

شرح اجرا



تخلیه بار

- ورود و تخلیه بار بلوک سیمانی (لیکا) جهت نصب در قسمت داخلی واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه بار مصالح (سیمان، ماسه، پودرسنگ، گچ)
- ورود و تخلیه بار انواع میلگرد جهت اجرای سازه
- ورود و تخلیه انواع لوله های گالوانیزه به جهت انجام فعالیت های تاسیساتی واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه بار درب و پنجره UPVC جهت اجرا در واحدهای مسکونی
- ورود و تخلیه لوله های پوشفیت و لوله های پنج لایه جهت اجرای تاسیسات مکانیکال
- ورود و تخلیه بار بلوک هبلکس جهت اجرا در قسمت پیرامونی واحدهای مسکونی

شرح اجرا

۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۳.۷.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۳.۸.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



